

MỤC LỤC

I. CÁC TÀI LIỆU LIÊN QUAN.....	4
II. NỘI DUNG CHÍNH	5
PHẦN 1 - NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG TRONG CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH SCL TÀI SẢN	5
Chương I - NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG.....	5
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng	5
Điều 2. Giải thích từ ngữ và các từ viết tắt.....	5
Điều 3. Nội dung và phạm vi sử dụng chi phí SCL.....	6
Chương II - PHÂN CẤP QUẢN LÝ CÔNG TÁC SCL	7
Điều 4. Quyền hạn và trách nhiệm của HĐTV EVNHCMC.....	7
Điều 5. Quyền hạn và trách nhiệm của Tổng Giám đốc EVNHCMC	7
Điều 6. Quyền hạn, trách nhiệm của Giám đốc các Công ty Điện lực.....	8
Điều 7. Quyền hạn, trách nhiệm của Giám đốc Công ty LDCT và các Đơn vị trực thuộc khác (ngoài các Công ty Điện lực)	8
Chương III - NỘI DUNG, CHU KỲ VÀ THỜI GIAN SCL	8
Điều 8. Nội dung công tác SCL	8
Điều 9. Chu kỳ SCL.....	9
Điều 10. Thời gian tiêu chuẩn ngừng vận hành để SCL.....	9
Chương IV - HƯỚNG DẪN LẬP KẾ HOẠCH SCL.....	11
Điều 11. Nội dung và trình tự lập kế hoạch SCL	11
Điều 12. Bố trí vốn công trình SCL.....	12
PHẦN 2 - QUY ĐỊNH CÔNG TÁC SCL MBA/TBĐ	14
Chương V - NGUYÊN TẮC CHUNG VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ SCL MBA/TBĐ	14
Điều 13. Nguyên tắc chung khi SCL MBA/TBĐ.....	14
Điều 14. Nhiệm vụ các Công ty Điện lực và Công ty LDCT trong công tác SCL MBA/TBĐ	14
Điều 15. Nhiệm vụ Công ty DVĐL trong công tác SCL MBA/TBĐ	15
Chương VI - TỔ CHỨC THỰC HIỆN SCL MBA/TBĐ	15
Điều 16. Thời gian sửa chữa MBA/TBĐ.....	15

Điều 17. Chọn ĐVSC sửa chữa MBA/TBĐ	15
Điều 18. Ký hợp đồng sửa chữa MBA/TBĐ	16
Điều 19. Giao nhận MBA/TBĐ cần sửa chữa	16
Điều 20. Công tác kiểm tu MBA/TBĐ	17
Điều 21. Xác nhận khối lượng sửa chữa MBA/TBĐ thực tế	17
Điều 22. Tiến hành sửa chữa MBA/TBĐ	17
Điều 23. Phát sinh trong quá trình sửa chữa MBA/TBĐ	18
Điều 24. Thu hồi vật tư thiết bị trong quá trình sửa chữa MBA/TBĐ	18
Điều 25. Tiến độ sửa chữa MBA/TBĐ.....	18
Điều 26. Thực hiện nghiệm thu công tác sửa chữa MBA/TBĐ	18
Điều 27. Công tác giao nhận MBA/TBĐ sau sửa chữa.....	19
Điều 28. Quyết toán sau khi sửa chữa MBA/TBĐ.....	19
Điều 29. Trách nhiệm bảo hành MBA/TBĐ sau sửa chữa.....	19
Điều 30. Thời gian bảo hành MBA/TBĐ sau sửa chữa.....	19
Điều 31. Sự cố trong thời gian bảo hành MBA/TBĐ sau sửa chữa	19
Điều 32. Chế độ báo cáo, cập nhật tình hình thực hiện SCL MBA/TBĐ	19
PHẦN 3 - QUY ĐỊNH CÔNG TÁC SCL Ô TÔ.....	21
Chương VII - NGUYÊN TẮC CHUNG VÀ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN	21
Điều 33. Nguyên tắc chung khi SCL ô tô	21
Điều 34. Trình tự thực hiện SCL ô tô	21
PHẦN 4 - QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VÀ QUYẾT TOÁN CHI PHÍ SCL	23
Chương VIII - QUY ĐỊNH CHUNG TRONG QUẢN LÝ CHI PHÍ SCL.....	23
Điều 35. Phân cấp quản lý sử dụng chi phí SCL	23
Điều 36. Quản lý chi phí SCL.....	23
Điều 37. Nội dung khác liên quan đến công trình SCL lưới điện và kiến trúc .	24
Chương IX - QUYẾT TOÁN DANH MỤC SCL HOÀN THÀNH.....	25
Điều 38. Nguyên tắc lập quyết toán công trình SCL hoàn thành	25
Chương X - CÁC KHOẢN MỤC CHI PHÍ SỬA CHỮA LỚN.....	26
Điều 39. Chi phí phục vụ công tác SCL	26
Điều 40. Chi phí sửa chữa lớn thiết bị	26

Điều 41. Chi phí xây dựng liên quan đến quá trình sửa chữa thiết bị (nằm ngoài thành phần công việc đã có trong định mức sửa chữa lớn)	27
Điều 42. Giá trị vật tư, thiết bị, phụ tùng thu hồi	27
Chương XI - QUY ĐỊNH VỀ THẨM TRA, PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH SCL HOÀN THÀNH	28
Điều 43. Nguyên tắc chung trong thẩm tra, phê duyệt quyết toán	28
Điều 44. Thành phần tham gia thực hiện.....	28
Điều 45. Nhiệm vụ của các Ban (Phòng) trong công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán danh mục SCL hoàn thành	29
Điều 46. Hình thức tổ chức thẩm tra, phê duyệt quyết toán	30
Điều 47. Chế độ báo cáo công tác thẩm tra phê duyệt quyết toán.....	31
PHẦN 5 - TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHUNG TRONG CÔNG TÁC SCL	32
Điều 48. Xử lý các phần việc chuyên tiếp	32
Điều 49. Chế độ báo cáo	32
Điều 50. Chế độ kiểm tra	32
Điều 51. Xử lý vi phạm.....	32
Điều 52. Trách nhiệm thi hành	32
Điều 53. Sửa đổi, bổ sung	33
Điều 54. Bảng tham chiếu tài liệu liên quan đến Quy định.....	33
III. PHỤC LỤC LƯU ĐỒ VÀ BIỂU MẪU	34

QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN CÔNG TÁC SỬA CHỮA LỚN TÀI SẢN TRONG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

I. CÁC TÀI LIỆU LIÊN QUAN

1. Quyết định số 3706/QĐ-EVNHCMC ngày 21/7/2025 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM về Quy định quản lý tài sản, nguồn vốn và huy động vốn trong Tổng công ty Điện lực TP.HCM;
2. Quyết định số 72/QĐ-HĐTV ngày 31/5/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực TP.HCM về Quy chế về công tác kế hoạch áp dụng trong Tổng công ty Điện lực TP.HCM;
3. Quyết định số 69/QĐ-HĐTV ngày 30/5/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực TP.HCM về việc ban hành Quy chế phân cấp giữa Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP.HCM;
4. Quyết định số 2589/QĐ-EVNHCMC ngày 30/5/2025 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM về Phân cấp cho Giám đốc các Đơn vị trực thuộc EVNHCMC;
5. Quyết định số 905/QĐ-EVN ngày 17/6/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về công tác Quản lý kỹ thuật trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
6. Quyết định số 71/QĐ-HĐTV ngày 30/5/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực TP.HCM về việc ban hành Quy chế quản trị trong Tổng công ty Điện lực TP.HCM;
7. Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định;
8. Các văn bản khác có liên quan.

II. NỘI DUNG CHÍNH

PHẦN 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG TRONG CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH SCL TÀI SẢN

Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về:

- a) Tổ chức, phân cấp quản lý trong công tác sửa chữa lớn tài sản đối với Tổng công ty Điện lực TP.HCM.
- b) Nội dung công tác sửa chữa lớn lưới điện, máy biến áp, VTTB điện có cấp điện áp vận hành đến 220 kV và các tài sản khác của các Đơn vị thuộc Tổng công ty Điện lực TP.HCM.
- c) Nội dung công tác quản lý và quyết toán chi phí sửa chữa lớn đối với Tổng công ty Điện lực TP.HCM.

2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với Tổng công ty Điện lực TP.HCM và các Đơn vị trực thuộc Tổng công ty Điện lực TP.HCM.

Điều 2. Giải thích từ ngữ và các từ viết tắt

1. EVN: Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
2. EVNHCMC: Tổng công ty Điện lực TP.HCM;
3. HĐTV: Hội đồng thành viên;
4. SCL: Sửa chữa lớn;
5. TSCĐ: Tài sản cố định;
6. PAKT-DT: Phương án kỹ thuật - dự toán;
7. VTTB: Vật tư thiết bị;
8. SXKD: Sản xuất kinh doanh.
9. ĐTXD: Đầu tư xây dựng;
10. GTGT: Giá trị gia tăng;
11. TCKT: Tài chính Kế toán;
12. KHVT: Kế hoạch Vật tư;
13. KD: Kinh doanh;
14. KT: Kỹ thuật;

15. KH: Kế hoạch;
16. KT&AT: Kỹ thuật và An toàn;
17. QLĐT: Quản lý Đầu tư;
18. CBKT: Cán bộ kỹ thuật;
19. MBA: Máy biến áp;
20. TBD: Thiết bị điện;
21. CBM: Sửa chữa bảo dưỡng theo tình trạng thiết bị.
22. RCM: Sửa chữa bảo dưỡng tập trung vào độ tin cậy;
23. ĐVSC: Đơn vị sửa chữa, là đơn vị được giao SCL MBA/TBD và đơn vị thi công SCL lưới điện, khác;
24. Phương tiện cơ giới: là phương tiện giao thông đường bộ, bao gồm:
 - a) Ô tô chở người: là ô tô có kết cấu, trang bị được dùng để chuyên chở người;
 - b) Ô tô chuyên dùng: là ô tô gắn kèm trang thiết bị chuyên dùng hoặc có cấu tạo đặc biệt theo yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ hoặc sử dụng cho nhiệm vụ đặc thù, đột xuất, cấp bách phục vụ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ quản lý vận hành, bảo trì sửa chữa hệ thống điện (ô tô tải, cầu,...);
25. Đơn vị: gồm Cơ quan Tổng công ty và các Đơn vị trực thuộc Tổng công ty;
26. Đơn vị trực thuộc là các Công ty hạch toán phụ thuộc thuộc Tổng công ty Điện lực TP.HCM, bao gồm các nhóm sau:
 - a) Nhóm 1: Các Công ty Điện lực hạch toán phụ thuộc, Công ty Lưới điện Cao thế thuộc Tổng công ty Điện lực TP.HCM;
 - b) Nhóm 2: Các Công ty hạch toán phụ thuộc còn lại, Cơ quan Tổng công ty Điện lực TP.HCM;
 - c) Nhóm 3: Các Công ty phụ thuộc hạch toán lấy thu bù chi thuộc Tổng công ty Điện lực TP.HCM.
27. Công ty DVĐL: Công ty Dịch vụ Điện lực;
28. Công ty LĐCT: Công ty Lưới điện Cao thế;
29. Công ty TNĐL: Công ty Thí nghiệm Điện lực.

Điều 3. Nội dung và phạm vi sử dụng chi phí SCL

1. Chi phí SCL TSCĐ là chi phí cho công việc duy tu, bảo dưỡng, thay thế sửa chữa những hư hỏng phát sinh trong quá trình hoạt động nhằm khôi phục lại năng lực hoạt động theo trạng thái hoạt động tiêu chuẩn ban đầu của TSCĐ.
2. Chi phí SCL được hạch toán vào chi phí trong năm theo số thực tế phát sinh.
3. TSCĐ dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh nào thì chi phí SCL được

hạch toán vào giá thành của hoạt động sản xuất kinh doanh đó. Trong quá trình SCL TSCĐ có thể thay thế thiết bị, phụ tùng hoặc bộ phận tài sản đảm bảo phù hợp với công nghệ hiện tại và đáp ứng yêu cầu của sản xuất, truyền tải, phân phối điện.

4. Chi phí SCL được phân thành 2 loại:

a) Chi phí SCL tự làm (tự thực hiện):

SCL tự làm là sản phẩm dịch vụ luân chuyển nội bộ trong đơn vị phục vụ cho hoạt động SXKD của đơn vị, chi phí SCL tự làm là chi phí phát sinh cho công việc SCL, được quyết toán theo qui định và được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Các đơn vị trực thuộc trong cùng một đơn vị cung cấp sản phẩm, dịch vụ SCL cho nhau là tự thực hiện.

b) Chi phí SCL thuê ngoài:

Chi phí sửa chữa lớn thuê ngoài là chi phí phải thanh toán cho người nhận thầu sửa chữa lớn theo hợp đồng, hóa đơn và theo quyết toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

5. Không sử dụng chi phí SCL để:

a) Mua sắm thay mới TSCĐ, nâng cấp TSCĐ và sửa chữa công trình phúc lợi;

b) Cải tạo, nâng cấp, bổ sung chức năng, mở rộng phạm vi vận hành;

c) Khắc phục, sửa chữa TSCĐ hư hỏng do nguyên nhân chủ quan trong quá trình vận hành tài sản, hoặc hư hỏng do lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành.

Chương II

PHÂN CẤP QUẢN LÝ CÔNG TÁC SCL

Điều 4. Quyền hạn và trách nhiệm của HĐTV EVNHCMC

1. Biểu quyết thông qua kế hoạch SCL hàng năm hoặc giai đoạn 5 năm của EVNHCMC và các đơn vị trực thuộc.

2. Chỉ đạo việc thực hiện các quy chế, quy định, định mức, tiêu chuẩn SCL của EVN tại EVNHCMC.

3. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch vốn SCL trình EVN phê duyệt.

4. Chỉ đạo thực hiện phân cấp cho các đơn vị trực thuộc để tạo sự chủ động cho các đơn vị trong việc thực hiện công tác SCL.

Điều 5. Quyền hạn và trách nhiệm của Tổng Giám đốc EVNHCMC

1. Xây dựng, trình HĐTV EVNHCMC, ban hành quyết định giao kế hoạch SCL hàng năm hoặc giai đoạn 5 năm cho các đơn vị trực thuộc.

2. Phê duyệt, điều chỉnh hoặc bổ sung danh mục cho các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện đối với:

a) Danh mục sửa chữa thiết bị (bao gồm thiết bị lưu điện), công trình và danh mục sửa chữa lưới điện 110 kV, lưới điện 220 kV (áp dụng cho Công ty LĐCT và các đơn vị trực thuộc khác không phải là Công ty Điện lực trực thuộc).

b) Danh mục, hạng mục sửa chữa có cải tiến, thay đổi công nghệ, chế tạo, thử nghiệm (bao gồm nội dung kỹ thuật, công nghệ chính).

c) Kiến trúc nhà điều hành, văn phòng làm việc.

3. Phân cấp cho các đơn vị trực thuộc phê duyệt và tổ chức thực hiện các công trình, các gói thầu mua sắm VTTB phục vụ SCL.

4. Tổ chức kiểm tra và giám sát định kỳ hoặc đột xuất việc thực hiện của các đơn vị trực thuộc về công tác SCL.

Điều 6. Quyền hạn, trách nhiệm của Giám đốc các Công ty Điện lực

1. Thực hiện phê duyệt danh mục các công trình SCL hàng năm trên cơ sở hạn mức chi phí SCL hàng năm đã được EVNHCMC phê duyệt. Riêng danh mục công trình SCL liên quan đến kiến trúc nhà điều hành, văn phòng làm việc của đơn vị thì phải trình EVNHCMC phê duyệt. Trường hợp vượt hạn mức chi phí SCL thì trình EVNHCMC xem xét phê duyệt bổ sung trước khi triển khai thực hiện.

2. Quyết định điều hòa vốn SCL giữa các công trình nhưng không vượt quá hạn mức chi phí SCL đã được EVNHCMC phê duyệt.

3. Tổ chức thực hiện và phê duyệt các thủ tục cho đến khi nghiệm thu và quyết toán công trình.

Điều 7. Quyền hạn, trách nhiệm của Giám đốc Công ty LĐCT và các Đơn vị trực thuộc khác (ngoài các Công ty Điện lực)

1. Lập và trình EVNHCMC phê duyệt, điều chỉnh hoặc bổ sung danh mục các công trình SCL hàng năm.

2. Tổ chức thực hiện và phê duyệt các thủ tục cho đến khi nghiệm thu và quyết toán công trình.

Chương III

NỘI DUNG, CHU KỲ VÀ THỜI GIAN SCL

Điều 8. Nội dung công tác SCL

1. Nội dung công tác SCL bao gồm:

a) Khảo sát đánh giá, phân tích tình trạng thiết bị, thí nghiệm đo đạc xác định các thông số kỹ thuật và số liệu theo qui định của thiết bị, lập PAKT-DT chi phí sửa chữa;

b) Mua sắm, chuẩn bị vật tư, nhân công phục vụ sửa chữa;

c) Thực hiện sửa chữa: Thí nghiệm, đo đạc lấy thông số vận hành trước SCL; tháo lắp, vệ sinh, kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế các bộ phận hoặc thiết bị bị hư hỏng;

d) Thí nghiệm, hiệu chỉnh, đo đạc đánh giá chất lượng sau SCL, tổ chức nghiệm thu, vận hành thử, bàn giao và bảo hành công trình, thiết bị.

2. Trong quá trình SCL có thể thay mới đối với các bộ phận hoặc thiết bị trong các trường hợp do:

a) Đã bị hư hỏng đến mức không thể sửa chữa phục hồi được hoặc chi phí sửa chữa phục hồi không kinh tế so với thay mới hoặc đã đến thời hạn thay thế. Các thiết bị thay thế phù hợp với công nghệ hiện tại;

b) Không đáp ứng được yêu cầu về tiêu chuẩn an toàn, môi trường, tin cậy trong vận hành.

3. Khi thực hiện các công việc SCL phải bảo đảm phục hồi chức năng, công suất, chất lượng của toàn bộ các chi tiết và bộ phận của hệ thống thiết bị hoặc công trình thuộc danh mục SCL. Thiết bị, công trình sau khi SCL phải đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy, kinh tế trong suốt khoảng thời gian tối thiểu đến kỳ SCL tiếp theo.

4. Để thuận lợi trong việc kiểm soát chu kỳ SCL, đánh giá chất lượng công trình SCL và để hạn chế việc cắt điện thi công nhiều lần, khuyến khích thực hiện như sau:

a) Đối với lưới điện trung thế, thực hiện SCL toàn diện theo từng tuyến dây hoặc theo đơn vị tài sản;

b) Đối với lưới điện hạ thế, thực hiện SCL theo khu vực trạm biến áp;

c) Đối với các trạm biến áp dạng trạm phòng, thực hiện SCL phần điện kết hợp với phần kiến trúc.

Điều 9. Chu kỳ SCL

1. Máy phát diesel: chu kỳ SCL thực hiện theo quy định trong tài liệu hướng dẫn bảo trì, sửa chữa của nhà chế tạo thiết bị và các văn bản hướng dẫn có liên quan của EVN và EVNHCMC.

2. Các công trình điện, máy biến áp truyền tải và các thiết bị khác: thời điểm SCL phụ thuộc kết quả vận hành, sử dụng, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất, nhưng đảm bảo thời gian từ lúc đưa vào vận hành đến lúc SCL và chu kỳ SCL như sau:

a) Đường dây tải điện, máy biến áp truyền tải và các thiết bị điện khác:

- Đường dây tải điện: chu kỳ SCL là 6 năm 1 lần, đối với đường dây ven biển chu kỳ SCL là 4 năm 1 lần;

- Cáp ngầm: thực hiện theo qui định của nhà chế tạo thiết bị và các văn bản hướng dẫn có liên quan của EVN và EVNHCMC.

- Máy biến áp truyền tải và các thiết bị điện khác: thời điểm đại tu phụ thuộc quy định của nhà chế tạo hoặc kết quả kiểm tra, thí nghiệm định kỳ, hoặc theo kết quả phân tích RCM/CBM.

b) Công trình xây dựng: đối với nhà cửa, công trình kiến trúc, công trình thủy công, đường xá (bao gồm đường công vụ vào tuyến để sửa chữa và phục vụ vận hành đường dây cao áp) chu kỳ sửa chữa lớn phụ thuộc vào quy trình bảo trì của công trình và kết quả theo dõi, kiểm tra định kỳ chất lượng cũng như các vấn đề phát sinh, song phải bảo đảm các yêu cầu về sự cần thiết, tiết kiệm và phải phù hợp với các quy định chuyên ngành.

c) Các loại TSCĐ khác: chu kỳ SCL thực hiện theo quy định của nhà chế tạo hoặc của Nhà nước. Trường hợp chưa có quy định, các đơn vị tự xây dựng định mức, kế hoạch để thực hiện phù hợp.

3. Phương tiện cơ giới:

a) Ô tô chở người

- Đối với ô tô mua mới: thời gian sử dụng trên 5 năm (60 tháng) hoặc 150.000 km lưu hành (tùy theo điều kiện nào đến trước) kể từ ngày mua sắm, nghiệm thu đưa vào sử dụng xe - SCL lần một.
- Đối với ô tô đã qua sửa chữa lớn:
 - + Ô tô SCL lần hai: thời gian sử dụng trên 4 năm (48 tháng) hoặc 100.000 km lưu hành (tùy theo điều kiện nào đến trước) kể từ ngày SCL lần một.
 - + Ô tô SCL lần ba trở đi: thời gian sử dụng trên 3 năm (36 tháng) hoặc 75.000 km lưu hành (tùy theo điều kiện nào đến trước) kể từ ngày SCL lần liền kề trước đó.

b) Ô tô chuyên dùng

- Đối với ô tô mua mới: thời gian sử dụng trên 4 năm (48 tháng) hoặc 90.000 km lưu hành (tùy theo điều kiện nào đến trước) kể từ ngày mua sắm, nghiệm thu đưa vào sử dụng ô tô. Riêng đối với ô tô cầu cần tính toán thêm yếu tố 1.500 giờ cầu để xem xét đề xuất sửa chữa lớn.
- Đối với ô tô đã qua SCL: thời gian sử dụng trên 3 năm (36 tháng) hoặc 60.000 km lưu hành (tùy theo điều kiện nào đến trước) kể từ ngày SCL lần trước.

Lưu ý: Chu kỳ sửa chữa ô tô nêu trên chỉ là điều kiện cần để xem xét, kiểm tra SCL ô tô. Các Đơn vị phải xem xét tình trạng hư hỏng thực tế của ô tô hoặc theo quy định của nhà sản xuất để thực hiện sửa chữa cho phù hợp, nhằm duy trì hoạt động ổn định, an toàn và đem lại hiệu quả kinh tế. Trường hợp ô tô bị hư hỏng đột xuất do khách quan hoặc thường xuyên vận hành ở vùng ven biển, Thủ trưởng Đơn vị sử dụng ô tô có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, xác định nguyên nhân và

quyết định chủ trương khắc phục, sửa chữa, đồng thời chịu trách nhiệm trước EVNHCMC về quyết định của mình.

4. Những trường hợp cần thiết phải rút ngắn hoặc kéo dài chu kỳ SCL, hoặc trong các trường hợp đặc biệt cần phải tiến hành SCL đột xuất phải được người có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 10. Thời gian tiêu chuẩn ngừng vận hành để SCL

1. Đối với các thiết bị điện, thiết bị lưu điện: thời gian đại tu thực hiện theo quy định trong tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa của nhà chế tạo thiết bị.

2. Đường dây tải điện cấp điện áp 110 kV trở lên: không vượt quá thời gian đã được người có thẩm quyền phê duyệt trong Phương án kỹ thuật thi công hoặc Thiết kế kỹ thuật thi công.

3. Các thiết bị và công trình khác tùy thuộc vào tình trạng kỹ thuật, khối lượng sửa chữa được phê duyệt.

4. Những trường hợp phải kéo dài hơn thời gian ngừng để đại tu so với thời gian tiêu chuẩn nêu trên do khối lượng công việc lớn phải được người có thẩm quyền phê duyệt.

Chương IV HƯỚNG DẪN LẬP KẾ HOẠCH SCL

Điều 11. Nội dung và trình tự lập kế hoạch SCL hàng năm

1. Quy ước:

- a) Năm N: năm kế hoạch thực hiện;
- b) Năm N-1: năm trước năm kế hoạch.

2. Các căn cứ để lập kế hoạch SCL:

- a) Nhu cầu sửa chữa của Đơn vị;
- b) Chi phí SCL trong kế hoạch giá thành sản phẩm của Đơn vị và hạn mức chi phí SCL của năm tương ứng.

3. Nội dung kế hoạch thực hiện SCL: gồm 02 bước

a) Bước chuẩn bị, được triển khai từ năm N-1, bao gồm:

- Giao kế hoạch vốn SCL năm N;
- Lập biên bản khảo sát thực trạng hư hỏng, lập và trình danh mục SCL. Lưu ý: VTTB điện khi thực hiện SCL phải có đầy đủ cơ sở dữ liệu trên Hệ thống quản lý kỹ thuật PMIS (đối với VTTB phải cập nhật trên PMIS theo quy định), theo đó, biên bản khảo sát thực trạng hư hỏng phải hiện rõ lý lịch, tình hình vận hành, số lần đã thực hiện SCL và hình ảnh của VTTB.

- Lập và trình phê duyệt PAKT-DT công trình (đối với việc sửa chữa VTTB điện, việc phê duyệt PAKT-DT phải căn cứ trên cơ sở dữ liệu trên Hệ thống quản lý kỹ thuật PMIS, biên bản khảo sát, kết quả phân tích, đánh giá CBM, RCM). Trong trường hợp cần thiết phải thuê tư vấn thì tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát và lập PAKT-DT, tư vấn thẩm tra (nếu có) hoặc EVNHCMC giao nhiệm vụ cho đơn vị trực thuộc khác có chức năng nhiệm vụ phù hợp để thực hiện khảo sát và lập PAKT-DT.
- Lập, trình duyệt kế hoạch và hoàn tất công tác lựa chọn nhà thầu cung cấp VTTB, thi công xây lắp, tư vấn giám sát, bảo hiểm công trình,...

b) Bước thực hiện, được triển khai trong năm N, bao gồm:

- Tổ chức thi công, quản lý chất lượng công trình;
- Nghiệm thu công trình, cập nhật lý lịch tài sản;
- Quyết toán công trình.

4. Hồ sơ chủ yếu của một công trình SCL:

- a) Biên bản khảo sát và đánh giá chi tiết hiện trạng VTTB, công trình;
- b) Văn bản chấp thuận thông qua danh mục công trình SCL;
- c) PAKT-DT công trình được phê duyệt;
- d) Quyết định giao kế hoạch SCL;
- đ) Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt;
- e) Các hợp đồng, phụ lục hợp đồng (nếu có), các bảo lãnh theo qui định;
- g) Hồ sơ hoàn công và Biên bản nghiệm thu;
- h) Hồ sơ quyết toán công trình;
- i) Quyết định phê duyệt quyết toán công trình.

Điều 12. Bố trí vốn công trình SCL

1. Xác định danh mục SCL năm N:

- a) Đối với các Công ty Điện lực: chậm nhất đến ngày 15 tháng 5 của năm thứ N-1, các Đơn vị hoàn tất phê duyệt danh mục các công trình SCL năm N (sau khi Tổng công ty giao hạn mức chi phí SCL năm N).
- b) Đối với Công ty LDCT và các Đơn vị khác (ngoài Công ty Điện lực):
 - Chậm nhất đến ngày 15 tháng 4 của năm thứ N-1, các Đơn vị trình EVNHCMC thông qua danh mục các công trình SCL. Theo đó, tên và mã công trình phải phù hợp theo biểu mẫu quy định tại Phụ lục 5.
 - Trên cơ sở hồ sơ danh mục các công trình SCL do các Đơn vị trình,

EVNHCMC sẽ tổ chức kiểm tra thực tế hiện trường để rà soát, cân đối và thống nhất sơ bộ nội dung các công trình SCL dự kiến trong năm thứ N, trước khi thông qua danh mục các công trình SCL.

2. Điều kiện ghi vốn SCL năm N:

- a) Các công trình được hoàn tất phê duyệt PAKT-DT.
- b) Nguyên tắc bố trí vốn các công trình SCL ưu tiên theo thứ tự sau:
 - Các công trình còn dở dang trong năm N-1;
 - Các công trình sửa chữa thiết bị đã hư hỏng;
 - Các công trình cấp bách để phòng ngừa sự cố có khả năng xảy ra;
 - Các công trình còn lại sẽ căn cứ theo nhu cầu tiến độ để bố trí kế hoạch.

3. Thời gian đăng ký kế hoạch vốn SCL

a) Thời gian đăng ký kế hoạch vốn SCL năm thứ N: các Đơn vị đăng ký kế hoạch SCL về EVNHCMC trước ngày 01 tháng 5 năm thứ N-1, theo đúng Quy định công tác kế hoạch của EVNHCMC, đính kèm danh mục công trình SCL theo biểu mẫu quy định tại Phụ lục 3.

b) Thời gian đăng ký điều chỉnh kế hoạch SCL năm thứ N: căn cứ tình hình thực hiện thực tế và dự kiến tiến độ hoàn tất các công trình SCL, các Đơn vị gửi báo cáo đăng ký điều chỉnh kế hoạch SCL của năm N về EVNHCMC trước ngày 15 tháng 7 của năm N.

c) Đối với các VTTB do EVNHCMC khai thác hộ: các Đơn vị đăng ký trong Kế hoạch SXKD&ĐTXD năm N theo yêu cầu tiến độ của Tổng công ty, đề EVNHCMC tổ chức, triển khai mua sắm tập trung và cấp cho các Đơn vị vào đầu năm N.

PHẦN 2

QUY ĐỊNH CÔNG TÁC SCL MBA/TBĐ

Chương V

NGUYÊN TẮC CHUNG VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ SCL MBA/TBĐ

Điều 13. Nguyên tắc chung khi SCL MBA/TBĐ

1. MBA/TBĐ được nêu trong Quy định này là TSCĐ do các Đơn vị quản lý. Do đó, khi mang MBA/TBĐ nào đi sửa chữa thì Đơn vị có trách nhiệm theo dõi MBA/TBĐ đó và có trách nhiệm thu hồi về Đơn vị sau khi sửa chữa hoàn tất hoặc thu hồi về để thực hiện thủ tục thanh lý theo đúng quy định phân cấp của EVNHCMC.

2. MBA/TBĐ được SCL bao gồm: MBA/TBĐ bị hư hỏng do sự cố; MBA/TBĐ đến hạn bảo trì, bảo dưỡng theo quy định của nhà sản xuất, của EVN; MBA/TBĐ đang vận hành nhưng kết quả kiểm tra định kỳ, đột xuất phát hiện thông số kỹ thuật không đạt tiêu chuẩn vận hành theo quy định.

Điều 14. Nhiệm vụ các Công ty Điện lực và Công ty LĐCT trong công tác SCL MBA/TBĐ

1. Thực hiện công tác kiểm tra, khảo sát tình trạng hư hỏng của MBA/TBĐ và xác định số lượng MBA/TBĐ cần sửa chữa trong năm N dựa trên các tiêu chí sau:

a) MBA/TBĐ không đạt yêu cầu vận hành theo kết quả kiểm tra định kỳ;

b) MBA/TBĐ đã vận hành lâu năm có xác suất hư hỏng cao (dựa vào kết quả thử nghiệm định kỳ cho thấy một hoặc một số thông số kỹ thuật chính đang có chiều hướng xấu nhanh hơn các năm trước mặc dù còn đạt ngưỡng cho phép vận hành; dựa vào thống kê kết quả thử nghiệm đột xuất cho thấy có sự gia tăng tỉ lệ hư hỏng, hoạt động bất thường của các MBA/TBĐ cùng chủng loại, cùng nhà sản xuất, cùng năm sản xuất...);

c) MBA/TBĐ đến hạn sửa chữa lớn theo quy định của nhà sản xuất, của EVN,...;

d) MBA/TBĐ bị sự cố, hư hỏng đã được các đơn vị thu hồi về kho.

2. Riêng đối với Công ty LĐCT, lập và trình EVNHCMC phê duyệt danh mục SCL MBA/TBĐ sau khi thực hiện kiểm tra, khảo sát tình trạng hư hỏng của MBA/TBĐ.

3. Tiếp theo đó, các Đơn vị lập danh sách chi tiết MBA/TBĐ cần sửa chữa và trình EVNHCMC quyết định điều chuyển về Công ty DVĐL để tập trung sửa chữa (trừ MBA truyền tải và các TBĐ mà Công ty DVĐL không thể đảm nhiệm sửa chữa).

Điều 15. Nhiệm vụ Công ty DVĐL trong công tác SCL MBA/TBĐ

1. Lập và phê duyệt PAKT-DT công trình SCL MBA/TBĐ, theo đó lưu ý:

a) PAKT-DT phải phân tách các thiết bị cần sửa chữa có cùng tính chất, nội dung công việc thành các nhóm phù hợp (mỗi nhóm tương ứng một phụ lục, ví dụ: nhóm các MBA đại tu không quấn dây và nhóm MBA đại tu có quấn lại cuộn dây, ...). Công tác phân nhóm này được thực hiện sao cho việc áp dụng đơn giá khi xây dựng dự toán hạng mục, dự toán công trình được thuận lợi và dễ dàng kiểm soát trong quá trình thực hiện SCL. Bảng dự toán công trình phải có bảng dự toán chi tiết của từng hạng mục;

b) Nội dung công việc của công trình sửa chữa lớn MBA/TBĐ phải tính toán cả phần nhân công và vật liệu cần thiết cho quá trình tháo thiết bị đang vận hành trên lưới điện, vận chuyển về nơi sửa chữa, lắp luân chuyển và đóng điện vận hành đối với MBA/TBĐ được cấp từ nguồn dự phòng (hoặc sau sửa chữa) được đưa lên lưới;

c) Trong PAKT-DT phải có mục quy định bước kiểm tra trước khi sửa chữa thiết bị để ghi nhận thực tế khi tháo rời MBA/TBĐ so với dự tính ban đầu, làm cơ sở sửa chữa và thanh quyết toán.

2. Sau khi có quyết định giao kế hoạch SCL MBA/TBĐ năm N, Đơn vị chọn ĐVSC và tiến hành các thủ tục sửa chữa theo qui định tại Chương VI của Quy định này.

3. Lưu ý, khi chuyển MBA/TBĐ cho ĐVSC, Đơn vị có trách nhiệm:

a) Thống kê, kiểm soát chủng loại và số lượng MBA/TBĐ đưa đi sửa chữa;

b) Theo dõi, đơn đốc việc sửa chữa MBA/TBĐ;

c) Thu hồi về đơn vị sau khi sửa chữa hoàn tất hoặc thu hồi về để thực hiện thủ tục thanh lý theo đúng quy định phân cấp của EVNHCMC.

Chương VI TỔ CHỨC THỰC HIỆN SCL MBA/TBĐ

Điều 16. Thời gian sửa chữa MBA/TBĐ

1. Các MBA/TBĐ phải được sửa chữa hoàn tất trong năm kế hoạch.

2. Theo hợp đồng thỏa thuận đối với các đơn vị trực thuộc EVNHCMC (Công ty DVĐL và Công ty TNĐL), thời gian sửa chữa hoàn tất MBA/TBĐ không quá **2 tháng** kể từ ngày các bên ký hợp đồng kiểm tra sửa chữa MBA/TBĐ.

Điều 17. Chọn ĐVSC sửa chữa MBA/TBĐ

ĐVSC phải là đơn vị có đủ năng lực thực hiện sửa chữa MBA/TBĐ. Trường hợp ĐVSC là đơn vị ngoài EVNHCMC phải đảm bảo có năng lực và tư cách pháp nhân trong lĩnh vực sửa chữa MBA/TBĐ. Theo đó:

1. Trường hợp Đơn vị chọn ĐVSC MBA/TBĐ là đơn vị trực thuộc EVNHCMC: Đơn vị tiến hành các bước thực hiện từ Điều 17 đến Điều 31 của Quy định này;

2. Trường hợp Đơn vị chọn ĐVSC MBA/TBĐ là đơn vị ngoài EVNHCMC thì phải tuân thủ theo quy định của Luật đấu thầu và các quy định, hướng dẫn của Nhà nước, EVN có liên quan. Sau khi chọn được ĐVSC MBA/TBĐ, Đơn vị tiến hành các bước thực hiện từ Điều 17 đến Điều 31 của Quy định này;

3. Đối với gói công việc tháo, lắp, luân chuyển MBA/TBĐ, Đơn vị có thể tự thực hiện hoặc thuê đơn vị có chức năng thực hiện và phải được cấp thẩm quyền chấp thuận.

Điều 18. Ký hợp đồng sửa chữa MBA/TBĐ

Căn cứ vào kết quả lựa chọn ĐVSC, các Đơn vị thực hiện ký hợp đồng sửa chữa MBA/TBĐ với ĐVSC, cụ thể như sau:

1. Trường hợp ĐVSC là đơn vị trực thuộc EVNHCMC: ĐVSC và Đơn vị ký biên bản giao nhận sửa chữa MBA/TBĐ, mỗi biên bản giao nhận sửa chữa MBA/TBĐ có thể gồm một hoặc nhiều MBA/TBĐ làm cơ sở để thanh toán nội bộ giữa 2 bên;

2. Trường hợp ĐVSC là đơn vị ngoài EVNHCMC: ĐVSC và Đơn vị ký hợp đồng sửa chữa MBA/TBĐ theo kết quả lựa chọn nhà thầu.

Điều 19. Giao nhận MBA/TBĐ cần sửa chữa

1. MBA/TBĐ cần sửa chữa được tập trung ở Công ty DVĐL (tổng kho), Công ty DVĐL và ĐVSC thống nhất lập bảng kế hoạch giao nhận và tiến độ sửa chữa MBA/TBĐ trong đó bao gồm việc phối hợp luân chuyển từng MBA/TBĐ sau khi sửa, MBA/TBĐ dự phòng để thay thế những MBA/TBĐ tương đương trong danh sách sửa chữa nhưng còn vận hành trên lưới nhằm đảm bảo tiến độ sửa chữa nhưng không làm thiếu hụt cơ sở dự phòng thiết bị và hạn chế phạm vi mất điện khi tháo lắp thiết bị.

2. Sau khi thống nhất kế hoạch giao nhận và tiến độ sửa chữa MBA/TBĐ, Đơn vị tiến hành các công việc liên quan nhằm tập kết MBA/TBĐ và thông báo giao máy cho ĐVSC. Phải lập Biên bản giao nhận MBA/TBĐ và phải ghi đầy đủ các thông tin vào biên bản, trong đó cần ghi rõ tình trạng của MBA/TBĐ và các phụ kiện đi kèm (nếu có).

3. Khi bàn giao MBA/TBĐ cho ĐVSC sửa chữa, ngoài Biên bản giao nhận, Đơn vị phải đính kèm lý lịch MBA/TBĐ và các tài liệu khác (nếu có) để phục vụ cho việc sửa chữa MBA/TBĐ.

4. Đối với các MBA/TBĐ ngoài PAKT-DT được duyệt nhưng mới bị hư hỏng trong năm, Đơn vị được phép bổ sung khối lượng phát sinh sửa chữa trên

nguyên tắc điều hòa đảm bảo không vượt hạn mức chi phí sửa chữa lớn trong năm của Đơn vị. Khối lượng phát sinh phải được bổ sung vào phụ lục hợp đồng nếu ĐVSC là đơn vị ngoài EVNHCMC.

Điều 20. Công tác kiểm tu MBA/TBĐ

1. ĐVSC phải thông báo bằng văn bản cho Đơn vị về thời gian và địa điểm tiến hành kiểm tu MBA/TBĐ.

2. Thành phần tham gia kiểm tu gồm:

a) ĐVSC: CBKT chuyên trách sửa chữa MBA/TBĐ của ĐVSC;

b) Đơn vị: Lãnh đạo Phòng KT&AT (hoặc Phòng/Đội phụ trách theo phân công tại Đơn vị), CBKT quản lý MBA/TBĐ của Đơn vị, cán bộ quản lý tài sản của Đơn vị.

3. Thực hiện kiểm tu:

a) ĐVSC và Đơn vị tiến hành kiểm tra, đánh giá hiện trạng của MBA/TBĐ so với dự tính ban đầu trong PAKT-DT được duyệt và cùng thống nhất lập biên bản kiểm tu. Đối với các thông số kỹ thuật phải thử nghiệm để có thông số đánh giá, trước khi tiến hành rút ruột hoặc rút vỏ MBA, ĐVSC phải kiểm tra, thí nghiệm các thông số và lập biên bản thử nghiệm MBA để làm căn cứ kết hợp với việc chứng kiến bên trong máy để xác định tình trạng của MBA;

b) Các nội dung trong biên bản kiểm tu phải được thông qua Giám đốc (hoặc Phó Giám đốc được phân công) của ĐVSC và Đơn vị.

Điều 21. Xác nhận khối lượng sửa chữa MBA/TBĐ thực tế

1. Trên cơ sở biên bản kiểm tu đã thống nhất, ĐVSC và Đơn vị xác nhận khối lượng công việc sửa chữa thực tế, chủng loại và khối lượng các VTTB thu hồi. Các biên bản kiểm tu, bảng khối lượng công việc cần sửa chữa, bảng khối lượng vật tư thu hồi, vật tư cần sử dụng phải được thể hiện rõ ràng, riêng biệt cho từng MBA/TBĐ.

2. Khối lượng sửa chữa thực tế, chủng loại và khối lượng các VTTB thu hồi đã được ĐVSC và Đơn vị thỏa thuận:

a) Là cơ sở để thực hiện thanh toán nội bộ giữa 2 bên trong trường hợp ĐVSC là đơn vị trực thuộc EVNHCMC;

b) Được xem là phụ lục hợp đồng bổ sung đính kèm theo hợp đồng sửa chữa MBA/TBĐ giữa ĐVSC và Đơn vị, để làm cơ sở nghiệm thu và thanh quyết toán hợp đồng về sau, trong trường hợp ĐVSC là đơn vị có tư cách pháp nhân.

Điều 22. Tiến hành sửa chữa MBA/TBĐ

Dựa trên cơ sở kết quả kiểm tu, bảng xác nhận khối lượng sửa chữa thực tế, ĐVSC tiến hành thực hiện các hạng mục sửa chữa MBA/TBĐ. Công tác thử nghiệm trước và sau khi sửa chữa MBA/TBĐ phải tuân theo các quy trình, quy định hiện hành của Bộ Công Thương, EVN và EVNHCMC.

Điều 23. Phát sinh trong quá trình sửa chữa MBA/TBĐ

Trong quá trình sửa chữa MBA/TBĐ, nếu ĐVSC phát hiện các hư hỏng khác mà trong biên bản kiểm tu, PAKT-DT, bản xác nhận khối lượng sửa chữa thực tế đã thỏa thuận không có hoặc phát sinh vật tư khi thi công sửa chữa:

1. Trường hợp ĐVSC là đơn vị trực thuộc EVNHCMC: ĐVSC phải thông báo ngay cho Đơn vị để cử người có trách nhiệm đến ĐVSC cùng kiểm tra và lập biên bản xác nhận các phát sinh trước khi tiến hành các bước tiếp theo.

2. Trường hợp ĐVSC là đơn vị ngoài EVNHCMC: ĐVSC và Đơn vị căn cứ trên các điều khoản được nêu trong hợp đồng đã ký kết để giải quyết các trường hợp phát sinh.

Điều 24. Thu hồi vật tư thiết bị trong quá trình sửa chữa MBA/TBĐ

Các vật tư thiết bị dư thừa không sử dụng hết và vật tư thiết bị thu hồi trong quá trình sửa chữa MBA/TBĐ phải được thu hồi đầy đủ, trừ trường hợp có quy định khác. Khi thu hồi vật tư, thiết bị, ĐVSC và Đơn vị phải lập biên bản thu hồi tại hiện trường, áp giá thu hồi và lập thủ tục nhập, xuất kho theo quy định của EVNHCMC.

Điều 25. Tiến độ sửa chữa MBA/TBĐ

Tiến độ sửa chữa MBA/TBĐ, được tính từ ngày ký biên bản giao nhận/hợp đồng sửa chữa MBA/TBĐ, do ĐVSC và Đơn vị thỏa thuận nhưng thời gian không được kéo dài hơn:

1. Đối với MBA phân phối:

a) MBA sửa chữa không quấn lại cuộn dây: không quá **30 ngày**;

b) MBA sửa chữa có quấn lại cuộn dây: không quá **60 ngày**;

2. Đối với MBA truyền tải: không quá **6 tháng**.

3. Đối với TBĐ: không quá **60 ngày**.

ĐVSC phải đảm bảo sửa chữa MBA theo đúng thời gian đã thỏa thuận.

Điều 26. Thực hiện nghiệm thu công tác sửa chữa MBA/TBĐ

Sau khi hoàn tất việc sửa chữa MBA/TBĐ, ĐVSC phối hợp với Đơn vị tiến hành nghiệm thu theo đúng quy định về việc nghiệm thu các công trình xây dựng do EVNHCMC ban hành.

Đối với hạng mục công việc tháo lắp, luân chuyển MBA/TBĐ, Đơn vị phải lập hồ sơ nghiệm thu đóng điện từng vị trí lắp thiết bị trên lưới, xác nhận khối lượng vật tư sử dụng, thu hồi (nếu có) để làm cơ sở nghiệm thu, quyết toán toàn công trình.

Điều 27. Công tác giao nhận MBA/TBĐ sau sửa chữa

ĐVSC và Đơn vị lập biên bản bàn giao tài sản MBA/TBĐ đã hoàn tất nghiệm thu kèm theo đầy đủ nhật ký sửa chữa MBA/TBĐ, biên bản thử nghiệm và các tài liệu kỹ thuật (nếu có) cho Đơn vị. Đơn vị phải vận chuyển MBA/TBĐ về kho dự phòng của Đơn vị trong vòng 10 ngày kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu bàn giao.

Điều 28. Quyết toán sau khi sửa chữa MBA/TBĐ

Các Đơn vị thực hiện quyết toán SCL MBA/TBĐ theo quy định tại Phần 4 của Quy định này.

Lưu ý quyết toán toàn bộ công trình bao gồm công việc sửa chữa MBA/TBĐ và hạn mục công việc tháo, lắp luân chuyển MBA.

Điều 29. Trách nhiệm bảo hành MBA/TBĐ sau sửa chữa

1. Bảo hành là trách nhiệm của ĐVSC đối với các MBA/TBĐ sau khi được sửa chữa tại ĐVSC. ĐVSC chịu trách nhiệm vận chuyển và sửa chữa MBA/TBĐ bị sự cố trong thời gian bảo hành nếu do sai sót của ĐVSC, cụ thể: lắp sai tiêu chuẩn, chi tiết thay thế không đạt yêu cầu, vật tư, phụ tùng, thiết bị thay thế không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật,...

2. Các trường hợp MBA/TBĐ bị sự cố trong thời gian bảo hành không do lỗi của ĐVSC thì Đơn vị phải thanh toán chi phí sửa chữa.

Điều 30. Thời gian bảo hành MBA/TBĐ sau sửa chữa

Thời gian bảo hành MBA/TBĐ sau sửa chữa do ĐVSC và Đơn vị thỏa thuận nhưng không được thấp hơn thời gian sau: 18 tháng kể từ ngày nghiệm thu bàn giao cho Đơn vị hoặc 12 tháng kể từ ngày đóng điện vận hành tùy theo trường hợp nào đến trước. Trong thời gian bảo hành, MBA/TBĐ hư hỏng phải ngừng vận hành để sửa chữa theo trách nhiệm bảo hành thì thời gian bảo hành đương nhiên được kéo dài thêm khoảng thời gian tương ứng thời gian ngừng vận hành để khắc phục hư hỏng.

Điều 31. Sự cố trong thời gian bảo hành MBA/TBĐ sau sửa chữa

Trong thời gian bảo hành, nếu MBA/TBĐ bị sự cố và Đơn vị xác định nguyên nhân hư hỏng có thể do chất lượng sửa chữa MBA/TBĐ thì Đơn vị thực hiện lập biên bản hiện trường và chụp hình trước khi giải tỏa hiện trường để thay MBA/TBĐ khác vào vận hành tiếp tục cấp điện. Sau đó, Đơn vị thông báo cho ĐVSC ngay trong ngày xảy ra sự cố hoặc chậm nhất là ngày hôm sau để cùng phối hợp điều tra xác định nguyên nhân sự cố MBA/TBĐ.

Điều 32. Chế độ báo cáo, cập nhật tình hình thực hiện SCL MBA/TBĐ

1. Các Đơn vị cập nhật thường xuyên tình hình sửa chữa MBA/TBĐ trên “Chương trình Quản lý tiến độ Sửa chữa lớn” của EVNHCMC và thực hiện báo cáo quản lý kỹ thuật hàng tháng do EVNHCMC quy định.

2. Các MBA/TBĐ được chuyển đi sửa chữa và thu hồi sau sửa chữa phải được cập nhật hàng tháng vào “Chương trình quản lý vật tư thiết bị trên lưới điện”. Đối với các MBA/TBĐ đã sửa chữa hoàn tất, các Đơn vị chụp, lưu thành tập tin các biên bản thử nghiệm và cập nhật vào “*Chương trình quản lý vật tư thiết bị trên lưới điện*” để theo dõi lịch sử vận hành của MBA/TBĐ.

PHẦN 3

QUY ĐỊNH CÔNG TÁC SCL Ô TÔ

Chương VII

NGUYÊN TẮC CHUNG VÀ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN SCL Ô TÔ

Điều 33. Nguyên tắc chung khi SCL ô tô

1. Văn phòng Tổng công ty/đơn vị làm đầu mối tổ chức thực hiện SCL (kể cả sửa chữa thường xuyên).
2. Các Đơn vị không được sửa chữa đối với ô tô: đã quá niên hạn sử dụng và không được phép lưu hành theo quy định hiện hành của Nhà nước; hoặc bị hư hỏng mà không thể sửa chữa hoặc việc sửa chữa không hiệu quả (dự toán chi phí sửa chữa lớn hơn 30% nguyên giá).

Điều 34. Trình tự thực hiện SCL ô tô

1. Khảo sát, lập biên bản khảo sát thực trạng hư hỏng.
 - a) Bước 1: Lựa chọn nhà thầu thực hiện kiểm tra, sửa chữa ô tô. Thủ trưởng Đơn vị lựa chọn nhà thầu có chức năng, kinh nghiệm để kiểm tra và sửa chữa ô tô. Khuyến khích các Đơn vị đưa ô tô vào các cơ sở, dịch vụ của nhà sản xuất, chính hãng để kiểm tra, sửa chữa;
 - b) Bước 2: Thành lập hội đồng khảo sát. Thủ trưởng Đơn vị quyết định thành lập hội đồng khảo sát để phối hợp với nhà thầu kiểm tra thực tế tình trạng hư hỏng của ô tô. Thành phần hội đồng khảo sát gồm: Lãnh đạo Đơn vị làm trưởng đoàn, các thành viên gồm: Chánh văn phòng, Tổ trưởng Tổ công xa, Nhân viên lái ô tô, đại diện các Phòng KHVT và TCKT;
 - c) Bước 3: Lập biên bản khảo sát thực trạng hư hỏng ô tô.
 - Việc kiểm tra xác định các hạng mục, chi tiết của ô tô cần sửa chữa, phục hồi phải được Hội đồng khảo sát và nhà thầu thống nhất, ghi nhận bằng biên bản khảo sát thực trạng hư hỏng ô tô.
 - Nội dung Biên bản khảo sát thực trạng hư hỏng phải ghi rõ các nội dung chính sau: (i) Thuyết minh: mô tả tính năng của ô tô (loại ô tô, nhãn hiệu, biển số, năm sản xuất, năm sử dụng,...), thống kê tình hình vận hành (số lần SCL đã thực hiện và thời điểm SCL gần nhất, tình trạng hư hỏng, giá trị thực hiện các lần SCL...); (ii) Kết quả kiểm tra; (iii) Phương án sửa chữa khắc phục, đơn giá sửa chữa; (iv) Mục tiêu đạt được sau SCL,...

Lưu ý: cần tham khảo ý kiến của nhân viên trực tiếp lái ô tô về tình trạng hư hỏng của ô tô khi xem xét các đề xuất của nhà thầu, trước khi quyết định các nội dung công việc SCL ô tô.

2. Lập và phê duyệt PAKT-DT công trình: Trên cơ sở Biên bản khảo sát thực trạng hư hỏng ô tô đã được lập nêu trên, Đơn vị lập và phê duyệt PAKT-DT công trình, làm cơ sở cho việc thương thảo, ký kết hợp đồng chính thức với nhà thầu để tiến hành SCL ô tô.

3. Giai đoạn thi công sửa chữa, nghiệm thu và thanh quyết toán công trình SCL ô tô: các Đơn vị tổ chức thực hiện theo đúng các quy định pháp lý hiện hành.

PHẦN 4

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VÀ QUYẾT TOÁN CHI PHÍ SCL

Chương VIII

QUY ĐỊNH CHUNG TRONG QUẢN LÝ CHI PHÍ SCL

Điều 35. Phân cấp quản lý sử dụng chi phí SCL

1. Đối với các Công ty Điện lực: EVNHCMC quản lý và thực hiện cấp chi phí SCL theo hạn mức.
2. Đối với Công ty LĐCT và các Đơn vị trực thuộc khác (ngoài các Công ty Điện lực): EVNHCMC quản lý và thực hiện cấp chi phí SCL theo danh mục công trình được duyệt.
3. Đơn vị chịu trách nhiệm quản lý nguồn chi phí được cấp, kiểm soát chi và sử dụng chi phí đúng quy định.

Điều 36. Quản lý chi phí SCL

1. Thủ trưởng các Đơn vị phải chịu trách nhiệm trước EVNHCMC, trước pháp luật về tính hợp pháp, hợp lý của các chứng từ, các khoản chi sửa chữa trong phạm vi của Đơn vị mình.

2. Đơn vị nhận chi phí được cấp phải có trách nhiệm quản lý sử dụng theo đúng chế độ quy định hiện hành.

Kế hoạch chi phí SCL của năm nào chỉ có giá trị trong kế hoạch năm đó, do đó các Đơn vị phải quan tâm đẩy nhanh tiến độ và thực hiện hoàn thành công trình SCL trong năm, tổ chức hạch toán kịp thời chi phí phát sinh và lập quyết toán công trình SCL hoàn thành để có cơ sở hạch toán chi phí SXKD của năm kế hoạch.

3. Chi phí SCL TSCĐ được hạch toán vào chi phí trong năm theo số thực tế phát sinh, trường hợp phát sinh các chi phí lớn phục vụ cho công tác SCL TSCĐ do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh (giảm lãi hoặc bị lỗ) thì đơn vị được thực hiện phân bổ khoản chi phí SCL TSCĐ, thời gian phân bổ không quá 3 năm kể từ ngày phát sinh khoản chi phí.

4. Đơn vị hạch toán chi phí sửa chữa lớn vào chi phí sản xuất kinh doanh trong năm khi công trình sửa chữa lớn hoàn thành. Thời điểm hoàn thành công trình sửa chữa lớn là thời điểm công tác chạy thử tổng hợp toàn bộ hệ thống, công trình kết thúc theo Quy định về công tác quản lý kỹ thuật của EVN và EVNHCMC.

5. Các công trình/danh mục SCL có nhiều hạng mục, Đơn vị thực hiện theo nguyên tắc cụ thể như sau:

a) Trường hợp các hạng mục có thể hoạt động độc lập, Đơn vị hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh kỳ kế toán tương ứng với thời điểm từng hạng mục

SCL hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng.

b) Trường hợp các hạng mục thuộc công trình SCL không hoạt động độc lập với nhau, Đơn vị hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ kế toán tương ứng thời điểm khi toàn bộ công trình SCL hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng.

6. Chi phí phát sinh liên quan đến sửa chữa bảo dưỡng theo CBM được hạch toán như sau:

a) Đối với chi phí thí nghiệm định kỳ theo CBM của các công trình, thiết bị không tiến hành sửa chữa lớn: hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ.

b) Đối với chi phí thí nghiệm định kỳ theo CBM của các công trình, thiết bị có phát sinh thực hiện sửa chữa lớn: toàn bộ chi phí thí nghiệm định kỳ và chi phí sửa chữa lớn phát sinh hạch toán vào khoản mục chi phí sửa chữa lớn.

Điều 37. Nội dung khác liên quan đến công trình SCL lưới điện và kiến trúc

1. Giám sát thực hiện SCL:

a) Giám đốc Đơn vị quản lý tài sản phải chỉ đạo thực hiện, kiểm tra, giám sát toàn bộ quá trình SCL.

b) Cán bộ được giao nhiệm vụ giám sát phải có chứng chỉ hành nghề giám sát (còn hiệu lực) và có đủ năng lực chuyên môn để đánh giá đầy đủ các nội dung SCL, bao gồm chất lượng vật tư thiết bị thay thế, phương án kỹ thuật, lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh và phải chịu trách nhiệm về chất lượng sửa chữa của hạng mục được giao giám sát sửa chữa.

c) Cán bộ thực hiện giám sát hạng mục SCL phải độc lập trong các quyết định về nghiệm thu chất lượng, biện pháp thi công, được phép bảo lưu ý kiến và báo cáo lên cấp trên khi thấy có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn, chất lượng đối với hệ thống thiết bị.

d) Cán bộ giám sát phải chịu trách nhiệm về chất lượng sửa chữa của hạng mục được giao giám sát sửa chữa.

đ) Cán bộ giám sát có quyền yêu cầu tạm ngừng thực hiện công việc sửa chữa trong các trường hợp sau:

- Phát hiện vật tư thiết bị thay thế không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật;
- Công tác lắp đặt, hiệu chỉnh không theo đúng hướng dẫn, quy định của nhà chế tạo;
- Công cụ dụng cụ sử dụng không đảm bảo an toàn cho con người và thiết bị;
- Tổ chức thi công không đúng phương án đã được phê duyệt;

- Thực hiện sai phương án kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật.

e) Trong quá trình giám sát nếu thấy cần thiết cán bộ giám sát có thể đề xuất với người có thẩm quyền để thực hiện những hạng mục thử nghiệm thêm nhằm đảm bảo chất lượng công tác sửa chữa.

2. Mua bảo hiểm:

- a) Đối với công trình SCL lưới và trạm điện có cấp điện áp ≤ 35 kV:

Tùy theo điều kiện thi công và tính chất phức tạp, kỹ thuật đặc thù của từng công trình, các Đơn vị xem xét tự quyết định việc mua hoặc không mua bảo hiểm công trình đối với các công trình SCL này.

b) Đối với công trình SCL lưới và trạm điện có cấp điện áp > 35 kV và công trình SCL thuê ngoài phải mua bảo hiểm:

- Bảo hiểm công trình do chủ đầu tư mua. Trường hợp phí bảo hiểm đã được tính vào giá hợp đồng với bên nhận thầu thì bên nhận thầu thực hiện mua bảo hiểm công trình theo quy định (người thụ hưởng là Chủ đầu tư);
- Bên nhận thầu phải thực hiện mua các loại bảo hiểm cần thiết (bảo hiểm cho xe, máy, thiết bị thi công, bảo hiểm đối với bên thứ ba, ...) để bảo đảm cho hoạt động của nhà thầu đúng theo quy định các điều khoản hợp đồng đã ký với chủ đầu tư và quy định của pháp luật hiện hành.

3. Điều kiện năng lực:

Tổ chức, cá nhân khi thực hiện tư vấn các công việc quản lý chi phí phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định.

Chương IX

QUYẾT TOÁN DANH MỤC SCL HOÀN THÀNH

Điều 38. Nguyên tắc lập quyết toán công trình SCL hoàn thành

1. Việc quyết toán công trình SCL hoàn thành phải thực hiện theo danh mục được phê duyệt và hồ sơ nghiệm thu kỹ thuật theo phân cấp. Một công trình SCL có thể do nhiều hạng mục công trình hợp lại, khi tất cả các hạng mục đó đều hoàn thành mới được quyết toán công trình SCL hoàn thành. Tất cả các công trình SCL hoàn thành đều phải lập hồ sơ quyết toán và được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đơn vị không được chia nhỏ công trình SCL đã được phê duyệt để quyết toán.

2. Trường hợp công trình SCL có nhiều hạng mục, vì lý do chính đáng không thể hoàn thành toàn bộ khối lượng được duyệt ban đầu (có văn bản chấp thuận của cấp có thẩm quyền), Đơn vị kiểm tra kỹ và xác định những phần khối lượng đã thực hiện để quyết toán theo quy định, không quyết toán phần khối lượng chưa thực hiện. Phần khối lượng chưa thực hiện, phải được làm các thủ tục theo quy định để đăng ký vào công trình SCL năm sau như công trình mới.

3. Công trình SCL hoàn thành trong thời hạn 30 ngày (kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu, bàn giao cho bên sử dụng) phải được lập xong quyết toán, tiến hành tổ chức thẩm tra, xét duyệt quyết toán và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Phòng TCKT của Đơn vị chủ trì, các bộ phận khác liên quan tham gia lập hồ sơ quyết toán công trình SCL theo chức năng, nhiệm vụ.

Chương X

CÁC KHOẢN MỤC CHI PHÍ SỬA CHỮA LỚN

Các Đơn vị chỉ được quyết toán những khoản chi phí đã chi khi có đầy đủ chứng từ hợp lý, hợp pháp trên cơ sở không vượt dự toán được duyệt. Cụ thể phương pháp lập các khoản mục chi phí như sau:

Điều 39. Chi phí phục vụ công tác SCL

1. Chi phí chuẩn bị SCL (chi phí khảo sát, lập phương án kỹ thuật sửa chữa lớn) do Đơn vị tự thực hiện thì không được tính khoản chi phí này trong quyết toán. Trường hợp cần thiết phải thuê tư vấn hoặc EVNHCMC giao nhiệm vụ cho đơn vị trực thuộc khác thực hiện khảo sát và lập phương án kỹ thuật, căn cứ hợp đồng, văn bản giao nhiệm vụ, dự toán, hóa đơn và các chứng từ liên quan, Đơn vị quyết toán vào chi phí SCL.

2. Chi phí kết thúc sửa chữa:

a) Chi phí nghiệm thu được quyết toán trên cơ sở chứng từ chi hợp lý, hợp lệ nhưng tối đa không vượt quá mức quy định hoặc dự toán được phê duyệt;

b) Chi phí chạy thử (không kể chi phí nhiên liệu) được quyết toán trên cơ sở chứng từ chi hợp lý, hợp lệ.

3. Chi phí giám sát được quyết toán vào chi phí SCL đối với các nội dung phải thuê tư vấn giám sát công tác sửa chữa do phát sinh ngoài lực lượng tự giám sát của Đơn vị hưởng lương sản xuất điện. Trường hợp này, căn cứ hợp đồng, hóa đơn và các chứng từ liên quan, Đơn vị quyết toán vào chi phí SCL.

Điều 40. Chi phí sửa chữa lớn thiết bị

1. Chi phí vật tư, thiết bị thay thế: là giá trị vật tư, thiết bị, thuế nhập khẩu, chi phí tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển, bảo hiểm và các loại phí, chi phí liên quan khác (nếu có) liên quan đến phần vật tư, thiết bị. Tất cả các chi phí đó không bao gồm thuế GTGT đầu vào.

2. Chi phí công tác sửa chữa:

a) Chi phí vật tư: là giá trị vật tư không bao gồm thuế GTGT đầu vào và chi quyết toán những vật tư thực tế sử dụng vào công tác sửa chữa lớn.

Đơn giá vật tư xuất dùng được xác định theo giá bình quân gia quyền. Những vật tư phục hồi: tính theo giá trị thu hồi cộng với chi phí phục hồi và chi phí vận

chuyển bốc dỡ (nếu có).

Đối với những loại vật tư đã xuất kho theo dự toán, nếu đã tính vào giá trị công trình sửa chữa lớn nhưng thực tế không sử dụng đơn vị phải làm thủ tục nhập kho và giảm giá trị công trình sửa chữa lớn.

b) Chi phí nhân công: được quyết toán theo khối lượng nghiệm thu thực tế trên cơ sở đơn giá định mức theo quy định hiện hành của pháp luật và hướng dẫn của EVNHCMC;

c) Chi phí máy thi công: gồm chi phí khấu hao thiết bị phục vụ sửa chữa, chi phí nhiên liệu, năng lượng sử dụng máy...sử dụng trong quá trình sửa chữa lớn. Đơn vị được quyết toán vào chi phí sửa chữa lớn đối với chi phí máy thi công đi thuê ngoài trên cơ sở hợp đồng, hóa đơn và các chứng từ liên quan hợp lệ. Đối với chi phí máy thi công của đơn vị (khấu hao, nhiên liệu, năng lượng....) sử dụng trong quá trình sửa chữa lớn được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh của đơn vị;

d) Chi phí chung, bao gồm: chi phí quản lý hành chính, lương bộ phận quản lý và phục vụ, trụ sở làm việc, chi phí điều hành sản xuất tại nơi sửa chữa, chi phí phục vụ công nhân, chi phí phục vụ tại hiện trường sửa chữa, ăn ca, an toàn điện và một số chi phí khác (nếu có).

Không thực hiện quyết toán vào chi phí sửa chữa lớn tự thực hiện đối với chi phí chung. Những chi phí này nếu trong quá trình thực hiện có phát sinh, có chứng từ đầy đủ hợp lý hợp lệ theo quy định thì được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh của đơn vị trong phạm vi (không vượt) giá trị xác định theo tỷ lệ chi phí chung theo quy định của EVNHCMC.

e) Đối với các công trình/nội dung công việc phát sinh chi phí di chuyển lực lượng thi công phục vụ sửa chữa (di chuyển thiết bị, máy móc, công nhân sửa chữa...), chi phí lán trại, nhà ở tại hiện trường phục vụ sửa chữa (nếu có) được lập dự toán để phê duyệt theo hướng dẫn của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc của EVNHCMC và được quyết toán vào chi phí sửa chữa lớn theo chứng từ hợp lệ, trong phạm vi dự toán được duyệt (nếu có).

Điều 41. Chi phí xây dựng liên quan đến quá trình sửa chữa thiết bị (nằm ngoài thành phần công việc đã có trong định mức sửa chữa lớn)

Chi phí làm dàn giáo phục vụ công tác sửa chữa thiết bị, sửa chữa/xây lại móng, bệ đỡ thiết bị, mái, tường bao nhà xưởng, trụ xà đỡ thiết bị,...: Đơn vị quyết toán vào chi phí sửa chữa lớn theo chi phí thực tế phát sinh với đầy đủ chứng từ hợp lệ, trong phạm vi dự toán được duyệt.

Điều 42. Giá trị vật tư, thiết bị, phụ tùng thu hồi

1. Đơn vị thành lập Hội đồng xác định giá trị vật tư thiết bị, phụ tùng thu hồi. Hội đồng gồm có: Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Đơn vị là chủ tịch hội đồng và các bộ phận có liên quan là thành viên để kiểm tra, xác định chính xác số lượng, chủng loại và phần trăm chất lượng còn lại của từng loại vật tư thu hồi.

2. Xác định đơn giá vật tư thu hồi: các Đơn vị căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước về thẩm định giá và hướng dẫn của EVNHCMC để xác định cho phù hợp.

3. Vật tư thu hồi phải được phân loại, những loại vật tư thu hồi không còn sử dụng phải hoàn chỉnh các thủ tục thanh xử lý, bán đấu giá thu hồi vốn, tránh để tồn kho lâu gây ứ đọng vốn. Những loại vật tư còn có thể tận dụng được, Đơn vị phải bảo quản chu đáo đảm bảo chất lượng để sử dụng lại.

4. Giá trị vật tư thu hồi được hạch toán giảm giá trị công trình SCL.

Chương XI

QUY ĐỊNH VỀ THẨM TRA, PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH SCL HOÀN THÀNH

Điều 43. Nguyên tắc chung trong thẩm tra, phê duyệt quyết toán

1. Các công trình SCL hoàn thành đều phải được thẩm tra, phê duyệt quyết toán theo phân cấp.

2. Nguyên tắc cơ bản của việc xét duyệt quyết toán công trình SCL hoàn thành là các khoản chi thực tế hợp pháp, hợp pháp theo chế độ hiện hành trên cơ sở dự toán, kế hoạch được duyệt.

Điều 44. Thành phần tham gia thực hiện

1. Tại EVNHCMC:

a) Ban TCKT chủ trì, các Ban KH, KT, QLĐT và VP Tổng công ty tham gia thẩm tra hồ sơ quyết toán công trình SCL hoàn thành theo chức năng, nhiệm vụ tại Phụ lục 8 đính kèm;

b) Thành phần Tổ thẩm tra quyết toán công trình SCL hoàn thành tại EVNHCMC gồm: Phó Tổng Giám đốc (Tổ trưởng), đại diện lãnh đạo Ban TCKT (Tổ phó thường trực), đại diện lãnh đạo Ban KH (Tổ phó) và các cán bộ các Ban TCKT, KH, KT, QLĐT, KD, Văn phòng (Tổ viên) theo quyết định của Tổng Giám đốc EVNHCMC;

c) Sau khi hoàn tất thẩm tra quyết toán, Tổ Thẩm tra quyết toán có nhiệm vụ báo cáo và trình Tổng Giám đốc EVNHCMC ký quyết định phê duyệt quyết toán công trình SCL hoàn thành.

2. Tại các Đơn vị:

a) Phòng TCKT Đơn vị chủ trì, các Phòng KT, KHVT, QLĐT, Văn Phòng tham gia thẩm tra hồ sơ quyết toán công trình SCL hoàn thành theo chức năng, nhiệm vụ tại Phụ lục 9 đính kèm;

b) Thành phần Tổ Thẩm tra quyết toán công trình SCL hoàn thành tại Đơn vị gồm: Phó Giám đốc (Tổ trưởng), đại diện lãnh đạo Phòng TCKT (Tổ phó thường

trực), đại diện lãnh đạo Phòng KHVT (Tổ phó) và các cán bộ các Phòng TCKT, KT&AT, KHVT, QLĐT, KD, Văn phòng (Tổ viên) theo quyết định của Giám đốc Đơn vị;

c) Sau khi hoàn tất thẩm tra quyết toán, Tổ Thẩm tra có nhiệm vụ báo cáo và trình Giám đốc Đơn vị ký quyết định phê duyệt quyết toán công trình SCL hoàn thành.

Điều 45. Nhiệm vụ của các Ban (Phòng) trong công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán danh mục SCL hoàn thành

1. Tại EVNHCMC:

a) Ban TCKT là đầu mối tiếp nhận, kiểm tra thủ tục, hồ sơ quyết toán công trình SCL hoàn thành do Công ty LDCT và Cơ quan Tổng công ty trình duyệt theo phân cấp và chuyển các Ban chức năng EVNHCMC tham gia thẩm tra các phần việc theo phân công;

b) Ban KH chịu trách nhiệm thẩm tra nội dung SCL của danh mục trong kế hoạch đã giao với thực tế thực hiện, hồ sơ pháp lý, hồ sơ kế hoạch, kế hoạch chi phí và xác định tính chất sử dụng nguồn chi phí SCL; thẩm tra khối lượng, đơn giá vật tư, thiết bị, phụ tùng A cấp thực tế sử dụng với dự toán được duyệt, thẩm tra khối lượng, giá trị vật tư thiết bị, phụ tùng thu hồi, quy đổi đơn vị tính các loại cấp thu hồi từ mét ra kg cho phù hợp với phiếu nhập kho;

c) Ban KT chịu trách nhiệm thẩm tra khối lượng công việc đã thực hiện trên hồ sơ nghiệm thu hoàn công và quyết toán với dự toán được duyệt (hoặc dự toán trúng thầu) tham gia thẩm tra khối lượng phần vật tư thu hồi nếu có;

d) Ban QLĐT chịu trách nhiệm thẩm tra khối lượng công việc các công trình SCL kiến trúc đã thực hiện trên hồ sơ nghiệm thu hoàn công và quyết toán với dự toán được duyệt (hoặc dự toán trúng thầu); thẩm tra đơn giá, định mức xây dựng, SCL theo dự toán được duyệt, thẩm tra chi phí nhân công, máy thi công trong quyết toán, tính hợp lệ của thủ tục giao thầu xây dựng.

đ) Văn phòng Tổng công ty chịu trách nhiệm thẩm tra khối lượng, chất lượng công việc SCL công xa, thẩm tra đơn giá SCL công xa theo phương án được duyệt.

2. Tại các Đơn vị:

a) Phòng TCKT chịu trách nhiệm:

- Tiếp nhận, kiểm tra thủ tục, hồ sơ pháp lý của quyết toán công trình SCL hoàn thành thuộc thẩm quyền Đơn vị thẩm tra, phê duyệt quyết toán theo phân cấp và chuyển các Phòng chức năng tham gia thẩm tra các phần việc theo phân công;
- Thẩm tra các chi phí hợp lý, hợp pháp;
- Tổng hợp, lập báo cáo thẩm tra quyết toán trình lãnh đạo Đơn vị phê duyệt.

b) Phòng KT&AT chịu trách nhiệm:

Thẩm tra khối lượng, chất lượng công việc SCL lưới và trạm điện kể cả công trình kiến trúc Phòng biến điện đã thực hiện, tham gia thẩm tra khối lượng phần vật tư thu hồi nếu có.

c) Phòng KHVT chịu trách nhiệm:

- Kiểm tra nội dung SCL của công trình trong kế hoạch đã giao với thực tế thực hiện, hồ sơ kế hoạch, kế hoạch chi phí và tính chất sử dụng nguồn chi phí SCL;
- Thẩm tra vật tư, thiết bị, phụ tùng thực tế sử dụng và thu hồi, quy đổi đơn vị tính các loại cấp thu hồi từ mét ra kg cho phù hợp với phiếu nhập kho.

d) Phòng QLĐT chịu trách nhiệm:

- Thẩm tra đơn giá, định mức xây dựng, SCL theo dự toán được duyệt, thẩm tra chi phí nhân công, máy thi công trong quyết toán các công trình SCL lưới điện, tính hợp lệ của thủ tục giao thầu xây dựng.
- Thẩm tra đơn giá, định mức xây lắp các công trình SCL kiến trúc theo phương án kỹ thuật - dự toán được duyệt, dự toán trúng thầu.

đ) Phòng KD chịu trách nhiệm:

Thẩm tra khối lượng, chất lượng công việc SCL hệ thống đo đếm đã thực hiện, tham gia thẩm tra khối lượng phần vật tư thu hồi (nếu có).

e) Văn phòng chịu trách nhiệm:

Thẩm tra khối lượng, chất lượng công việc SCL công xa, kiến trúc, thẩm tra đơn giá SCL công xa theo phương án được duyệt.

Sau khi thẩm tra xong, các phòng tham gia thẩm tra hồ sơ, số liệu quyết toán phải thể hiện ý kiến bằng văn bản: phiếu thẩm tra quyết toán các công trình SCL và báo cáo thẩm tra quyết toán công trình SCL (Phụ lục 10) và cùng ký báo cáo thẩm tra quyết toán.

Điều 46. Hình thức tổ chức thẩm tra, phê duyệt quyết toán

Ban (Phòng) TCKT là đầu mối tiếp nhận hồ sơ quyết toán công trình SCL hoàn thành. Sau khi xem xét hồ sơ nếu đã đầy đủ thì tổ chức thẩm tra theo một trong hai hình thức:

1. Tập trung họp thẩm tra hồ sơ, tài liệu. Trường hợp này, tất cả các Ban (Phòng) thuộc đối tượng quy định tại Điều 45 tập trung họp thẩm tra. Sau khi thẩm tra xong thì cùng ký vào báo cáo thẩm tra quyết toán do Ban (Phòng) TCKT lập (Phụ lục 10).

2. Giao hồ sơ tài liệu cho từng Ban (Phòng) liên quan thuộc đối tượng quy định tại Điều 45. Các Ban (Phòng) có liên quan sau khi thẩm tra xong thì gửi lại hồ sơ và ý kiến bằng văn bản cho Ban (Phòng) TCKT để tổng hợp và lập báo cáo thẩm tra quyết toán.

Trên cơ sở văn bản nêu ý kiến thẩm tra của các Ban (Phòng) chức năng, Ban

(Phòng) TCKT tổng hợp, lập báo cáo thẩm tra quyết toán, bảng tổng hợp duyệt quyết toán kinh phí SCL, quyết định phê duyệt quyết toán công trình SCL (Phụ lục 10) trình lãnh đạo EVNHCMC hoặc lãnh đạo Đơn vị phê duyệt theo phân cấp.

Điều 47. Chế độ báo cáo công tác thẩm tra phê duyệt quyết toán

1. Đối với các Đơn vị:

Các Đơn vị phải thực hiện báo cáo tình hình thẩm tra và phê duyệt quyết toán các công trình SCL hoàn thành và các quyết định phê duyệt quyết toán của đơn vị theo quy định của EVNHCMC.

2. Đối với EVNHCMC:

EVNHCMC tổng hợp tình hình thẩm tra và phê duyệt quyết toán các công trình SCL hoàn thành chung của EVNHCMC để báo cáo EVN theo quy định.

PHẦN 5

TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHUNG TRONG CÔNG TÁC SCL

Điều 48. Xử lý các phản việc chuyển tiếp

1. Đối với các công trình đang thực hiện dở dang: thực hiện các nội dung còn lại theo quyền hạn quy định tại Quy định này.
2. Trường hợp còn vướng mắc trong quá trình thực hiện, các Đơn vị thành viên báo cáo về EVNHCMC để được hướng dẫn xử lý.

Điều 49. Chế độ báo cáo

Căn cứ kế hoạch SCL hàng năm được giao, các Đơn vị được giao quản lý phải cập nhật thường xuyên tình hình thực hiện kế hoạch SCL trên chương trình Quản lý tiến độ các công trình SCL của EVNHCMC và thực hiện theo chế độ báo cáo của EVNHCMC hiện hành.

Điều 50. Chế độ kiểm tra

1. Tất cả hoạt động về công tác SCL của các Đơn vị phải chịu sự kiểm tra của EVN, EVNHCMC và cấp có thẩm quyền theo định kỳ hoặc đột xuất.
2. Ban Kiểm tra Thanh tra và Pháp chế chủ trì phối hợp các Ban chức năng liên quan kiểm tra định kỳ công tác SCL của các Đơn vị, trên cơ sở Quy định này và các quy định hiện hành của Nhà nước, EVN, EVNHCMC về công tác SCL.

Điều 51. Xử lý vi phạm

EVNHCMC sẽ xử lý nghiêm các Đơn vị, cá nhân cố ý thực hiện chậm trễ tiến độ, vi phạm các quy định và báo cáo thiếu trung thực trong quá trình thực hiện các công trình SCL, làm ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của EVNHCMC.

Điều 52. Trách nhiệm thi hành

1. Các đối tượng áp dụng nêu tại khoản 2 Điều 1 có trách nhiệm thi hành Quy định này.
2. Giám đốc các Đơn vị trực thuộc, trên cơ sở Quy định này và tình hình thực tế tại đơn vị mình, có trách nhiệm:
 - a) Tổ chức xây dựng và ban hành quy định chi tiết tại đơn vị, đồng thời chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm Quy định này.
 - b) Phân công bộ phận chuyên môn chủ trì thực hiện: tổng hợp, lưu trữ hồ sơ hoàn chỉnh của tất cả các công trình SCL để dễ kiểm tra, theo dõi, theo đó, tất cả hồ sơ công trình SCL phải được số hóa, ký số và lưu trên chương trình Quản lý tiến độ sửa chữa lớn theo tiêu chuẩn ISO; thường xuyên cập nhật tiến độ thực hiện các công trình vào chương trình Quản lý tiến độ sửa chữa lớn.
3. Người được HĐQT EVNHCMC phân cấp theo các quy định của Quy định này phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền

và trước HĐQT EVNHCMC về các quyết định của mình trong quá trình thực hiện công tác SCL.

Điều 53. Sửa đổi, bổ sung

Trong quá trình thực hiện Quy định này, nếu có khó khăn vướng mắc, các Ban chức năng EVNHCMC và các Đơn vị thành viên báo cáo, đề xuất biện pháp xử lý về EVNHCMC để xem xét, sửa đổi, bổ sung.

Điều 54. Bảng tham chiếu tài liệu liên quan đến Quy định

Căn cứ 1	Căn cứ 2	Căn cứ 3	Căn cứ 4	Căn cứ 5	Căn cứ 6	Quy định
	Điều 1					Điều 1
	Điều 2					Điều 2
Điều 4				Điều 45	Điều 2	Điều 3
		Điều 3				Điều 4, 5
			Điều 9			Điều 6, 7
				Điều 45		Điều 8
				Điều 46		Điều 9
	Điều 18					Điều 11, 12
			Điều 9			Điều 35
Điều 4				Điều 5		Điều 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43

1. Căn cứ 1: Quyết định số 3706/QĐ-EVNHCME ngày 21/7/2025 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM về Quy định quản lý tài sản, nguồn vốn và huy động vốn trong Tổng công ty Điện lực TP.HCM;

2. Căn cứ 2: Quyết định số 72/QĐ-HĐTV ngày 31/5/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực TP.HCM về Quy chế về công tác kế hoạch áp dụng trong Tổng công ty Điện lực TP.HCM;

3. Căn cứ 3: Quyết định số 69/QĐ-HĐTV ngày 30/5/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực TP.HCM về việc ban hành Quy chế phân cấp giữa Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh;

4. Căn cứ 4: Quyết định số 2589/QĐ-EVNHCME ngày 30/5/2025 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM về phân cấp cho Giám đốc các Đơn vị trực thuộc EVNHCM.

5. Căn cứ 5: Quyết định số 905/QĐ-EVN ngày 17/6/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về công tác Quản lý kỹ thuật trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

6. Căn cứ 6: Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

III. PHỤC LỤC LƯU ĐỒ VÀ BIỂU MẪU

1. Lưu đồ

a) Phụ lục 1: Lưu đồ quy trình công tác lập và thực hiện kế hoạch SCL của Công ty Điện lực và đơn vị trực thuộc khác (*ngoài Công ty LDCT*).

b) Phụ lục 2: Lưu đồ quy trình công tác lập và thực hiện kế hoạch SCL của Công ty LDCT.

2. Biểu mẫu

a) Phụ lục 3: Mẫu đăng ký danh mục công trình SCL.

b) Phụ lục 4: Mẫu báo cáo tiến độ thực hiện các công trình SCL.

c) Phụ lục 5: Mã hạng mục, công trình, vốn SCL và mã đơn vị.

d) Phụ lục 6: Biên bản giao nhận MBA/TBĐ.

đ) Phụ lục 7: Báo cáo công tác sửa chữa MBA/TBĐ.

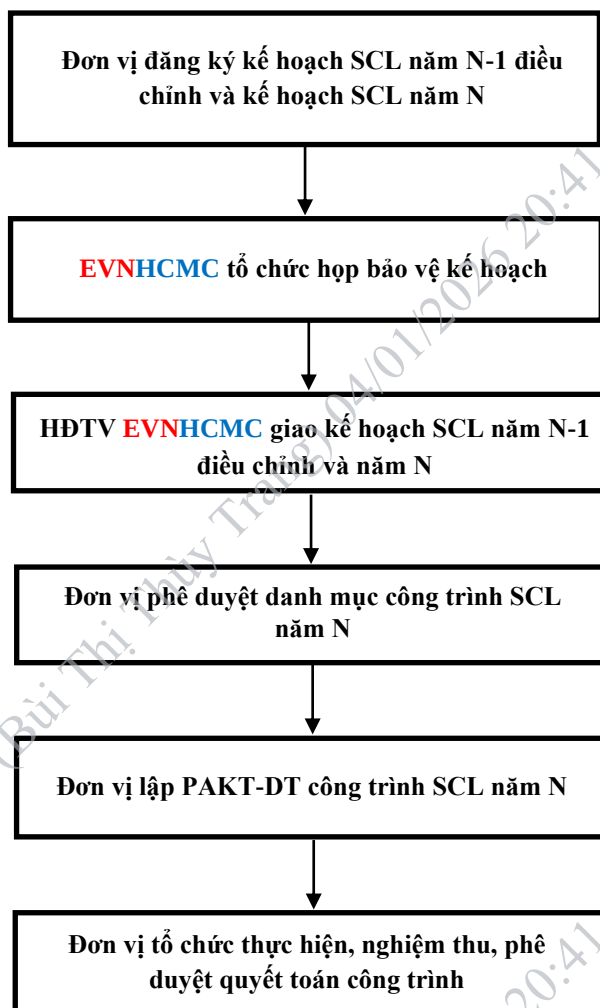
e) Phụ lục 8: Lưu đồ quy trình thẩm tra, quyết toán công trình SCL tại Tổng công ty Điện lực TP.HCM.

g) Phụ lục 9: Lưu đồ quy trình quyết toán công trình SCL tại các đơn vị.

h) Phụ lục 10: Mẫu hồ sơ quyết toán.

i) Phụ lục 11: Mẫu biên bản khảo sát thực trạng hư hỏng.

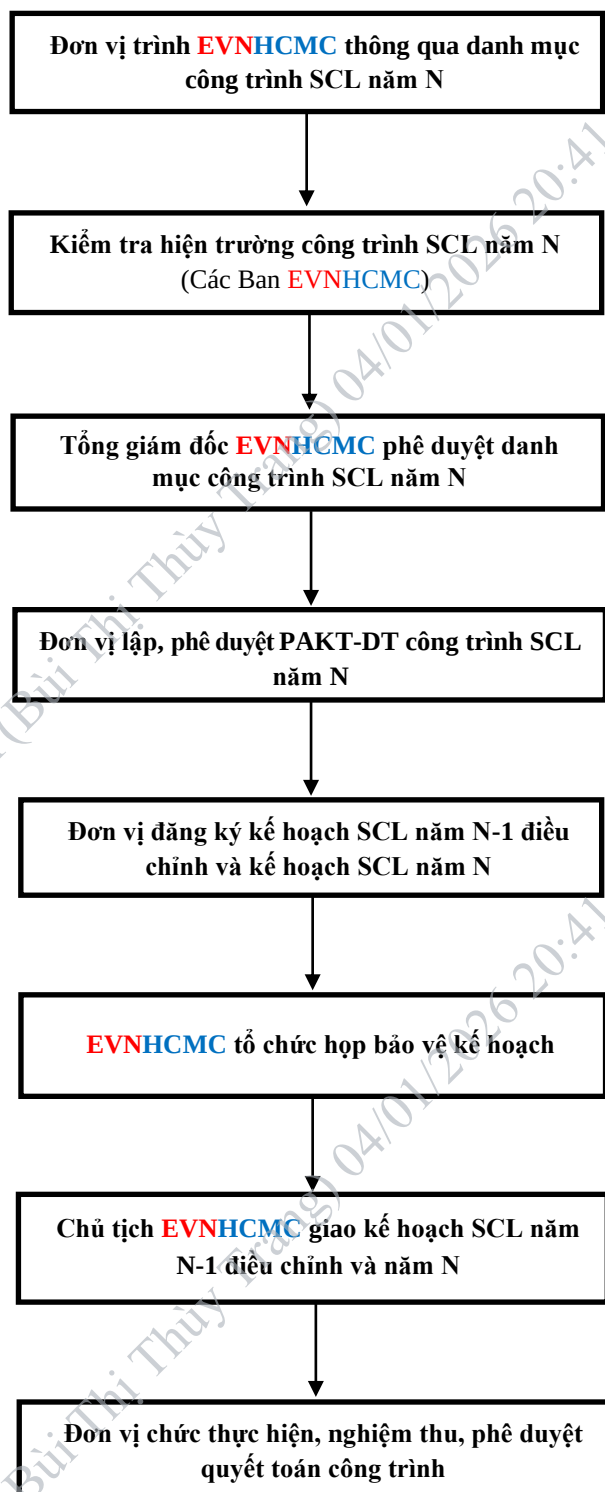
Phụ lục 1. Lưu đồ quy trình công tác lập và thực hiện kế hoạch SCL của Công ty Điện lực



Ghi chú

CTDL:	Công ty Điện lực
SCL:	Sửa chữa lớn
PAKT-DT:	Phương án kỹ thuật – Dự toán

Phụ lục 2. Lưu đồ quy trình công tác lập và thực hiện kế hoạch SCL của Công ty Lưới điện Cao thế và đơn vị trực thuộc khác (ngoài các Công ty Điện lực)



Ghi chú

SCL: Sửa chữa lớn
PAKT-DT: Phương án kỹ thuật – Dự toán
Đ: Đúng
S: Sai

Phụ lục 3

BẢNG ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH SCL NĂM.....

ĐƠN VỊ :

(đính kèm theo văn bản số ngày))

Tổng giá trị :

Trong đó :

1. Lưới & trạm điện :

2. Viễn thông :

3. Kiến trúc :

4. Công xa :

5. Thiết bị :

6. Sửa chữa khác :

Danh mục công trình (vượt quyền hạn quyết định của đơn vị)

Stt	Mã công trình	Tên công trình	Nội dung công việc chính	Giá trị khái toán	QĐ phê duyệt PAKT-DT	Ngày duyệt	Giá trị dự toán	Thời điểm đại tu gần nhất
	Tổng							
	I. Lưới & trạm điện							
								
	II. Thiết bị							
								
	III. Kiến trúc							
								
	IV. Công xa							
								
	V. Sửa chữa khác							
								

Ghi chú:

- Tên công trình phải thể hiện tên tài sản đưa ra sửa chữa và phân công việc chính thực hiện.

- Nội dung công việc chính phải thể hiện: Mã số tài sản và mã số thiết bị (serial number), phạm vi thực hiện (tên trạm, vị trí bắt đầu, vị trí kết thúc...) và nội dung công việc chính.

BÁO CÁO TỔNG HỢP CÔNG TÁC SCL

[illegible]

Phụ lục 5

MÃ HẠNG MỤC - MÃ NGUỒN VỐN - MÃ ĐIỆN LỰC - MÃ CÔNG TRÌNH SCL

I. Mã hạng mục công trình

STT	Mã	Tên hạng mục
1	1	Đại tu lưới 220kV
2	2	Đại tu VTTB, trạm 220kV
3	3	Đại tu lưới 110kV
4	4	Đại tu VTTB, trạm 110kV
5	5	Đại tu lưới trung hạ thế, trạm hạ thế
6	6	Đại tu thiết bị trung hạ thế (máy phát, MBT, Re...)
7	7	Đại tu công trình xây dựng dân dụng
8	8	Đại tu công xa
9	9	Đại tu hệ thống CNTT, SCADA
10	10	Đại tu TSCĐ khác

II. Mã nguồn vốn sửa chữa lớn: D

III. Mã đơn vị

STT	Mã	Tên đơn vị
1	SGO	Công ty Điện lực Sài Gòn
2	CLO	Công ty Điện lực Chợ Lớn
3	GDI	Công ty Điện lực Gia Định
4	TTH	Công ty Điện lực Tân Thuận
5	BPH	Công ty Điện lực Bình Phú
6	BCH	Công ty Điện lực Bình Chánh
7	HMO	Công ty Điện lực Hóc Môn
8	APD	Công ty Điện lực An Phú Đông
9	CCH	Công ty Điện lực Củ Chi
10	TDU	Công ty Điện lực Thủ Đức
11	VTA	Công ty Điện lực Vũng Tàu
12	DDO	Công ty Điện lực Đất Đỏ
13	BDU	Công ty Điện lực Bình Dương
14	TAN	Công ty Điện lực Thuận An
15	BCA	Công ty Điện lực Bến Cát
16	DCT	Công ty Lưới điện Cao thế
17	NG	Tổng Công ty Điện lực TP HCM
18	BLD	Ban Quản lý dự án Lưới điện TP HCM
19	BPP	Ban Quản lý dự án Lưới điện phân phối TP HCM
20	KHA	Trung tâm Chăm sóc khách hàng
21	HTD	Trung tâm Điều độ Hệ thống điện TP HCM
22	CNG	Công ty Công nghệ Thông tin TP HCM
23	TND	Công ty Thí nghiệm Điện lực TP HCM
24	VVT	Công ty Dịch vụ Điện lực TP HCM

IV. Mã công trình (gồm 12 ký tự):

"XXX": ký tự 1+2+3+" - Mã đơn vị
"X": ký tự 5 - Mã nguồn vốn
"XX": ký tự 6+7 - Mã năm thực hiện
"XX": ký tự 8+9 - Mã hạng mục
"XXX": ký tự 10+11+12 - Số thứ tự của CT trong hạng mục

Phụ lục 6
BIÊN BẢN GIAO NHẬN MBT/TBĐ

TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC TP HỒ CHÍ MINH
TÊN ĐƠN VỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BB-...

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm

BIÊN BẢN GIAO NHẬN MÁY BIẾN THÉ/THIẾT BỊ ĐIỆN

- Đơn vị giao:
- Đơn vị nhận:

Stt	MSTS	Hiệu	Công suất (kVA)	Số serial	Điện áp định mức sơ cấp/thứ cấp (kV)	Tình trạng MBT/TBĐ giao nhận	Phụ kiện, tài liệu đính kèm

ĐƠN VỊ GIAO (Tên đơn vị)
Người giao Lãnh đạo
(ký tên, đóng dấu)

ĐƠN VỊ NHẬN (Tên đơn vị)
Người nhận Lãnh đạo
(ký tên, đóng dấu)

Phụ lục 7
BÁO CÁO CÔNG TÁC SỬA CHỮA MBT/TBĐ

BÁO CÁO CÔNG TÁC SỬA CHỮA MBT/TBĐ THÁNG.../...CỦA CÔNG TY...
(Từ ngày 01/.../... đến ngày .../.../...)




STT	MSTS	Hiệu	Số serial	Công suất (kVA)	Điện áp định mức sơ cấp/thứ cấp (kV)	Công ty sửa chữa
MBT/TBĐ sửa chữa hoàn tất trong tháng						
1						
.						
MBT/TBĐ đã chuyển đi sửa chữa trong tháng						
1						
.						
MBT/TBĐ đang gửi sửa chữa đến tháng báo cáo (không bao gồm MBT/TBĐC đã sửa chữa hoàn tất)						
1						
.						

Ghi chú: Thời gian báo cáo từ ngày 01 đến ngày cuối cùng của tháng

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

Phụ lục 8
LƯU ĐỒ QUY TRÌNH THẨM TRA, QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH SỬA CHỮA LỚN TẠI TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.HCM






BƯỚC	THỜI GIAN	NỘI DUNG	TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN	DIỄN GIẢI
1	Ngày n	Bắt đầu Hồ sơ quyết toán SCL hoàn thành các đơn vị trình duyệt	B.TCKT	Đầu mỗi tiếp nhận, kiểm tra thủ tục, hồ sơ quyết toán do các đơn vị trình.
2	Thời gian thực hiện: $\leq$ ngày n+2	↓ Thẩm tra quyết toán	B.TCKT	Chuyển hồ sơ cho các Ban chức năng thẩm tra theo các phần việc được phân công.
3	Thời gian thực hiện: $\leq$ ngày n+10	Chưa đạt ↖ Trách nhiệm của Tổ thẩm tra ↓ Đạt ↓ Lập, ký báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán ↓ 1	B.TCKT, phối hợp cùng các thành viên Tổ thẩm tra	- Ban KT chịu trách nhiệm thẩm tra khối lượng công việc đã thực hiện trên hồ sơ nghiệm thu hoàn công và quyết toán với dự toán được duyệt (hoặc dự toán trúng thầu) tham gia thẩm tra khối lượng phần vật tư thu hồi nếu có (thời gian thực hiện $\leq$ 1 ngày). - Ban KH chịu trách nhiệm thẩm tra nội dung SCL của danh mục trong kế hoạch đã giao với thực tế thực hiện, hồ sơ pháp lý, hồ sơ kế hoạch, kế hoạch chi phí và xác định tính chất sử dụng nguồn chi phí SCL; thẩm tra khối lượng, đơn giá vật tư, thiết bị, phụ tùng A cấp thực tế sử dụng với dự toán được duyệt, thẩm tra khối lượng, giá trị vật tư thiết bị, phụ tùng thu hồi, quy đổi đơn vị tính các loại cấp thu hồi

BƯỚC	THỜI GIAN	NỘI DUNG	TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN	DIỄN GIẢI
				từ mét ra kg cho phù hợp với phiếu nhập kho (thời gian thực hiện ≤ 1 ngày) - Ban QLĐT chịu trách nhiệm thẩm tra khối lượng công việc các công trình SCL kiến trúc đã thực hiện trên hồ sơ nghiệm thu hoàn công và quyết toán với dự toán được duyệt (hoặc dự toán trúng thầu); thẩm tra đơn giá, định mức xây dựng, SCL theo dự toán được duyệt, thẩm tra chi phí nhân công, máy thi công trong quyết toán, tính hợp lệ của thủ tục giao thầu xây dựng (thời gian thực hiện ≤ 1 ngày). - Văn phòng Tổng công ty chịu trách nhiệm thẩm tra khối lượng, chất lượng công việc SCL công xa, thẩm tra đơn giá SCL công xa theo phương án được duyệt (thời gian thực hiện ≤ 1 ngày). - Ban khác có liên quan (nếu có) (thời gian thực hiện ≤ 1 ngày).
4	Thời gian thực hiện: $\leq$ ngày n+15		B.TCKT	Tổng hợp các ý kiến, số liệu có liên quan, kiểm tra các số liệu và xác định giá trị quyết toán công trình, trình lãnh đạo phê duyệt quyết toán công trình.
5	Lưu trữ hồ sơ: ≤ 05 ngày kể từ ngày phê duyệt quyết toán		B.TCKT	B.TCKT lưu trữ hồ sơ

Ghi chú:

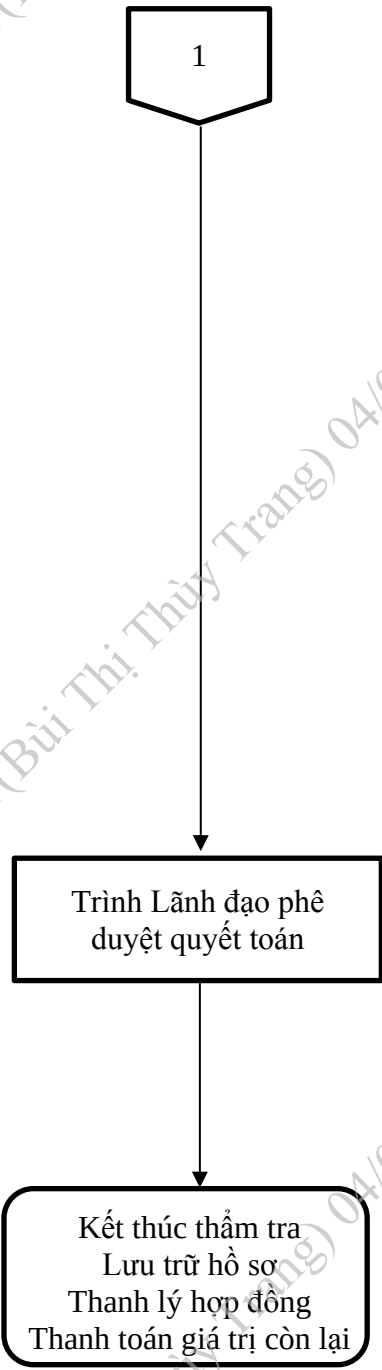
- Thời gian cho việc hoàn tất công tác quyết toán công trình SCL hoàn thành là không quá 30 ngày kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng.
- Trách nhiệm và thời hạn lập báo cáo thẩm tra, quyết toán có thể thực hiện theo sự phân công cụ thể của Lãnh đạo Tổng công ty.
- n: là tính theo số ngày làm việc.

Phụ lục 9
LƯU ĐỒ QUY TRÌNH QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH SỬA CHỮA LỚN TẠI
ĐƠN VỊ

BƯỚC	THỜI GIAN	NỘI DUNG	TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN	DIỄN GIẢI
1	Ngày n	 <pre> graph TD A[Bắt đầu Nghiệm thu hoàn thành] --> B[Tập hợp hồ sơ, tổng hợp quyết toán A-B] </pre>	ĐVTC P.KT&AT	Đơn vị thi công (ĐVTC): tập hợp hồ sơ hoàn công, biên bản nghiệm thu, bảng xác nhận khối lượng (BXNKL). - Phòng KT&AT: kiểm tra bảng XNKL, hồ sơ nghiệm thu, hoàn công do ĐVTC chuyển.
2	Thời gian thực hiện: ≤ ngày n+10	 <pre> graph TD B[Tập hợp hồ sơ, tổng hợp quyết toán A-B] --> C{Kiểm tra hồ sơ, Chuẩn bị lập quyết toán} </pre>	P.KT&AT ĐVTC P.KHVT	-P.KT&AT: Tập hợp tất cả hồ sơ nghiệm thu, hoàn công chuyển đến phòng KHVT để phối hợp với ĐVTC thực hiện quyết toán A-B. - P.KHVT: tập hợp phiếu xuất nhập kho để chuyển ĐVTC thực hiện công tác quyết toán A-B. - ĐVTC: thực hiện quyết toán A-B theo các biểu mẫu theo quy chế SCL.
3	Thời gian thực hiện: ≤ ngày n+12	 <pre> graph TD C{Kiểm tra hồ sơ, Chuẩn bị lập quyết toán} -- Chưa đạt --> B C -- Đạt --> D[Lập hồ sơ quyết toán] </pre>	P.KHVT P.TCKT P.KT&AT	- P. KHVT: kiểm tra các biểu tổng hợp quyết toán chi phí do ĐVTC chuyển (quyết toán A-B), kiểm tra hồ sơ nghiệm thu, hoàn công liên quan đến công trình để chuẩn bị lập hồ sơ quyết toán.
4	Thời gian thực hiện: ≤ ngày n+15	 <pre> graph TD D[Lập hồ sơ quyết toán] --> E[Thực hiện quyết toán hoàn tất và chuyển các Phòng, Đội liên quan ký xác nhận] </pre>	P.KHVT	Lập hồ sơ quyết toán, chuyển hồ sơ quyết toán đến các phòng, đội có liên quan ký, trình lãnh đạo phê duyệt. Sau đó chuyển lại P.TCKT để thực hiện thẩm tra quyết toán.
5	Thời gian thực hiện: ≤ ngày 02	 <pre> graph TD E[Thực hiện quyết toán hoàn tất và chuyển các Phòng, Đội liên quan ký xác nhận] --> F[Kết thúc quyết toán, Thanh toán hoàn tất các CP liên quan còn lại cho nhà thầu và hạch toán CP hoàn tất] </pre>	P.TCKT P.KHVT	- P.TCKT: hạch toán CP. - P.KHVT: kiểm tra hồ sơ để thanh toán các chi phí còn lại cho nhà thầu như: CP xây lắp, tư vấn,...; theo dõi bảo lãnh bảo hành.

LƯU ĐỒ QUY TRÌNH THẨM TRA CÔNG TRÌNH SỬA CHỮA LỚN TẠI ĐƠN VỊ

BƯỚC	THỜI GIAN	NỘI DUNG	TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN	DIỄN GIẢI
1	Ngày n	Bắt đầu Hồ sơ quyết toán SCL hoàn thành	P.TCKT	Tập hợp hồ sơ quyết toán công trình SCL hoàn thành, phân công thẩm tra, chuyển hồ sơ cho tổ thẩm tra thực hiện thẩm tra theo quy định
2	- Thời gian thực hiện: $\leq$ ngày n+2	↓ Chưa đạt ↶ Thẩm tra quyết toán	P.TCKT	Chuyển hồ sơ quyết toán gửi các thành viên tổ thẩm tra để thực hiện thẩm định theo quy định.
3	- Thời gian thực hiện: $\leq$ ngày n+10	↓ Đạt Trách nhiệm của Tổ thẩm tra ↓ Đạt Lập, ký báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán ↓ 1	P.TCKT, phối hợp cùng các thành viên Tổ thẩm tra	- P.TCKT: chịu trách nhiệm tổng hợp các ý kiến và lập báo cáo thẩm tra quyết toán, chuyển các thành viên tổ thẩm tra ký xác nhận (thời gian thực hiện $\leq$ 1 ngày). - P.KT&AT: chịu trách nhiệm thẩm tra khối lượng, chất lượng công việc SCL lưới và trạm điện kể cả kiến trúc và vật tư thu hồi nếu có. (thời gian thực hiện $\leq$ 1 ngày). - P.KHVT: chịu trách nhiệm kiểm tra nội dung SCL của công trình trong kế hoạch đã giao với thực tế thực hiện, thẩm tra VTTB thực tế sử dụng và thu hồi...(thời gian thực hiện $\leq$ 1 ngày) -P.QLĐT: chịu trách nhiệm thẩm tra đơn giá, định mức xây dựng theo dự toán được duyệt, chi phí

BƯỚC	THỜI GIAN	NỘI DUNG	TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN	DIỄN GIẢI
				nhân công, MTC trong quyết toán công trình SCL lưới điện và kiến trúc. (thời gian thực hiện ≤ 1 ngày) - Văn phòng: chịu trách nhiệm thẩm tra khối lượng SCL công xa, kiến trúc và thẩm tra đơn giá SCL theo phương án được duyệt... (thời gian thực hiện ≤ 1 ngày). - Phòng kinh doanh chịu trách nhiệm thẩm tra khối lượng, chất lượng công trình SCL hệ thống đo đếm đã thực hiện và vật tư thu hồi nếu có (thời gian thực hiện ≤ 1 ngày).
4	- Thời gian thực hiện: $\leq$ ngày n+15		P.TCKT	- Tổng hợp các ý kiến, số liệu có liên quan, kiểm tra các số liệu và xác định giá trị quyết toán công trình, trình lãnh đạo phê duyệt quyết toán công trình.
5	- Lưu trữ hồ sơ: ≤ 05 ngày kể từ ngày phê duyệt quyết toán		P.TCKT P.KHVT	-P. TCKT lưu trữ hồ sơ và hạch toán chi phí. -P.KHVT: theo dõi thanh lý hợp đồng, làm việc với nhà thầu để thanh toán giá trị còn lại và theo dõi bảo hành.

Ghi chú:

- Thời gian cho việc hoàn tất công tác quyết toán công trình SCL hoàn thành là không quá 30 ngày kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng.
- Trách nhiệm và thời hạn lập báo cáo thẩm tra, quyết toán có thể thực hiện theo sự phân công cụ thể của Lãnh đạo đơn vị.
- n: tính theo số ngày làm việc.

PHỤ LỤC 10
HỒ SƠ QUYẾT TOÁN DANH MỤC SỬA CHỮA LỚN

TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC TP HỒ CHÍ MINH
ĐƠN VỊ:.....

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

....., ngày tháng năm....

V/v đề nghị duyệt quyết toán
danh mục SCL hoàn thành

Kính gửi :

Căn cứ vào quyết định số ngày tháng năm của về việc giao
kế hoạch sửa chữa lớn năm cho

Căn cứ vào (các) bản phê duyệt dự toán số ngày tháng năm
của

Căn cứ vào hồ sơ quyết toán lập ngày..... Đề nghị duyệt quyết
toán (các) danh mục với (tổng) giá trị quyết toán trước thuếđồng.
(Bằng chữ:.....)

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU /NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký tên và đóng dấu)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu

Ghi chú: Nếu có nhiều danh mục cùng đề nghị duyệt thì đơn vị ghi có: Bảng kê chi tiết kèm theo.

TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC TP HỒ CHÍ MINH
ĐƠN VỊ:.....

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

....., ngày tháng năm....

BẢN THUYẾT MINH QUYẾT TOÁN

- Tên danh mục
- Giá trị vốn kế hoạch : tr.đồng
- Thuộc kế hoạch vốn sửa chữa lớn năm
- Hình thức tự làm hay thuê ngoài
- Tên đơn vị thi công
- Giá trị dự toán được duyệt đồng
- Thời gian khởi công
- Thời gian hoàn thành
- Giá trị quyết toán danh mục hoàn thành đồng
- Khối lượng công việc chủ yếu đã tiến hành (thay thế, sửa chữa những bộ phận nào của TSCĐ).
- Các căn cứ về chế độ để lập quyết toán
 - +
 - +
- Phân tích các nhân tố tăng giảm so với dự toán được duyệt.
- Đánh giá hiệu quả của công việc sửa chữa lớn (hiệu quả của việc thay thế các thiết bị so với sửa chữa các thiết bị đã hư hỏng và hiệu quả khôi phục tính năng của tài sản cố định nói chung sau khi sửa chữa.
- Các kiến nghị (nếu có).

NGƯỜI ĐỪNG ĐẦU/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký tên và đóng dấu)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu

TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC TP HỒ CHÍ MINH
ĐƠN VỊ:.....

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

....., ngày tháng năm....

BẢNG TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN KINH PHÍ SỬA CHỮA LỚN

Tên danh mục

Nội dung chi phí	Dự toán được duyệt	Giá trị quyết toán	Ghi chú
I- Chi phí thiết bị			
1- Giá trị thiết bị			
2- Thuế NK (nếu có)			
3- Chi phí tiếp nhận, vận chuyển... (nếu có)			
...			
II- Chi phí xây lắp			
1- Chi phí vật liệu			
2- Chi phí nhân công			
a) NC phần không áp dụng đơn giá ĐTXD			
b) NC phần áp dụng đơn giá ĐTXD			
3- Chi phí máy thi công (nếu có)			
4- Chi phí chung (nếu có)			
5- Thu nhập chịu thuế tính trước (nếu có)			
Giá trị xây lắp trước thuế			
6- Thuế GTGT đầu ra (nếu có)			
III- Chi phí khác			
1- Chi phí khảo sát (nếu có)			
2- Chi phí nghiệm thu (nếu có)			
IV- Chi phí Dự phòng			
V- Giá trị VTTB thu hồi			
VI- Giá trị quyết toán (I + II + III-V)			

Kế toán trưởng

NGƯỜI ĐÚNG ĐẦU/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(ký tên đóng dấu)

TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC TP HỒ CHÍ MINH
ĐƠN VỊ:.....

BẢNG TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN CHI PHÍ THIẾT BỊ, VẬT TƯ, PHỤ TÙNG SCL
Tên danh mục SCL

TT	Tên và quy cách VTTB, phụ tùng	ĐVT	Theo dự toán duyệt			Theo quyết toán			Ghi chú
			Số lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)	Số lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)	
I	VTTB, phụ tùng nhập khẩu								
II	VTTB, phụ tùng trong nước								
	Tổng cộng								

Người lập

TP Vật tư

Kế toán trưởng

Người đứng đầu/Người được ủy quyền
(Ký tên và đóng dấu)

TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC TP HỒ CHÍ MINH
ĐƠN VỊ:.....

BẢNG TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN CHI PHÍ NHÂN CÔNG SCL
Tên danh mục SCL

TT	Mã ĐM	Tên công việc	ĐVT	Theo dự toán duyệt			Quyết toán		
				Khối lượng	Đơn giá	Thành tiền	Khối lượng	Đơn giá	Thành tiền

Người lập

TP TC&NS

Kế toán trưởng

Người đứng đầu/Người được ủy quyền
(Ký tên và đóng dấu)

TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC TP HỒ CHÍ MINH
ĐƠN VỊ:.....

BẢNG TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN CHI PHÍ CA MÁY THI CÔNG SCL
Tên danh mục SCL

TT	Tên máy thi công	ĐVT	Theo dự toán duyệt			Theo quyết toán			Ghi chú
			Số lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)	Số lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)	
	Tổng cộng								

Người lập

Kế toán trưởng

Người đứng đầu/Người được ủy quyền
(Ký tên và đóng dấu)

TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC TP HỒ CHÍ MINH
ĐƠN VỊ:.....

BẢNG QUYẾT TOÁN GIÁ TRỊ VTTB PHỤ TÙNG THU HỒI

Tên danh mục SCL

TT	Tên quy cách VTTB phụ tùng thu hồi	ĐVT	Theo dự toán duyệt			Theo quyết toán				Ghi chú
			Số lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)	Số lượng	Đơn giá (theo giá thị trường)	Đánh giá tình trạng % chất lượng còn lại	Giá đề nghị thu hồi (đồng)	
	Tổng cộng									

Người lập

TP Vật tư

Kế toán trưởng

Người đứng đầu/Người được ủy quyền
(Ký tên và đóng dấu)

TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC TP HỒ CHÍ MINH
ĐƠN VỊ:.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngàytháng.....năm

PHIẾU THẨM TRA QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH SỬA CHỮA LỚN

Tên công trình SCL:.....

Mã công trình:

Đơn vị quản lý:

Phương thức chọn thầu thực hiện:

- Tự làm
- Thuê ngoài (hợp đồng sốngày)
- Đơn vị thực hiện:

Nội dung kiểm tra:

- Khối lượng, chất lượng công việc đã tiến hành.
- Khối lượng vật tư, thiết bị, phụ tùng thực tế sử dụng và thu hồi.
- Tính chất sử dụng nguồn vốn SCL
- Danh mục và giá trị SCL trong kế hoạch đã giao với thực tế thực hiện, hồ sơ kế hoạch, kế hoạch vốn.
- Tính hợp lệ của thủ tục giao thầu tư vấn, xây lắp.
- Đơn giá định mức xây dựng, theo dự toán được duyệt, thẩm tra chi phí nhân công, máy thi công trong quyết toán.

Kết quả kiểm tra:

-
-
-
-

Trưởng Phòng

Nhân viên thẩm tra

Ghi chú: nhân viên thẩm tra ghi phần nội dung được phân công thẩm tra.

TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC TP HỒ CHÍ MINH
ĐƠN VỊ:.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BC-.....

Thành phố Hồ Chí Minh, ngàytháng.....năm

BÁO CÁO THẨM TRA QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH SỬA CHỮA LỚN

Căn cứ hồ sơ quyết toán công trình:

Tổ thẩm tra quyết toán công trình sửa chữa lớn Công ty Điện lực thẩm tra hồ sơ quyết toán công trình với kết quả như sau:

I/- Nội dung thẩm tra:

- Tên công trình SCL:
- Đơn vị quản lý:
- Phương thức chọn thầu thực hiện:
- Hợp đồng số:
- Đơn vị thực hiện:

Nội dung cụ thể:

1/ Phần xây dựng:

- Số dự toán:
- Số quyết toán:
- Số thẩm tra:
- Số chênh lệch:

2/ Phần thiết bị:

- Số dự toán:
- Số quyết toán:
- Số thẩm tra:
- Số chênh lệch:

3/ Phần kiến thiết cơ bản khác:

Nội dung	Dự toán được duyệt	Giá trị quyết toán	Số thẩm tra	Chênh lệch
Chi phí thiết kế				
Chi phí thẩm định				
Chi phí khác				

Chi phí dự phòng				
Tổng cộng				

II/ Kết luận:

Sau khi xem xét thẩm tra hồ sơ, tổ thẩm tra quyết toán chấp thuận tổng giá trị quyết toán công trình nêu trên: đồng

Tổng số: đồng

Xây dựng: đồng

Thiết bị: đồng

KTCB khác: đồng

Kính trình và đề nghị Giám đốc phê duyệt.

THÀNH VIÊN TỔ THẨM TRA QUYẾT TOÁN

Nguyễn Văn A

P.KT

Nguyễn Văn C

P.KHVT

Nguyễn Văn B

P.TCKT

Nguyễn Văn Đ

Văn phòng

Nguyễn Văn D

P.QLĐT

Nguyễn Văn E

.....

TCKT

KT

KHVT

QLĐT

Văn phòng

.....

Nguyễn Văn A

Nguyễn Văn B

Nguyễn Văn C

Nguyễn Văn D

Nguyễn Văn Đ

Nguyễn Văn E

TỔ TRƯỞNG TỔ THẨM TRA

.....

Ghi chú: thành viên tham gia theo phân công của từng đơn vị cho từng loại công trình SCL (VD: Kiến trúc, công xa, thiết bị, lưới điện,...).

TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC TP HỒ CHÍ MINH
ĐƠN VỊ:.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-PC...

Thành phố Hồ Chí Minh, ngàytháng.....năm...

QUYẾT ĐỊNH
V/v phê duyệt quyết toán công trình sửa chữa lớn hoàn thành

Tên công trình:
Chủ đầu tư: Công ty Điện lực
Kế hoạch vốn năm: 20...
Nguồn vốn : Sửa chữa lớn

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC

Căn cứ Quyết định số...../QĐ-EVNHCMC ngày.....tháng.....năm.....của Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực TP.HCM về việc ban hành quy chế thực hiện công tác sửa chữa lớn trong Tổng công ty Điện lực TPHCM;

Căn cứ quyết định số...../QĐ-EVNHCMC ngày tháng năm.... về việc giao kế hoạch sửa chữa lớn năm.....;

Căn cứ quyết định số....../QĐ-PC... ngày...tháng ..năm...về việc giao danh mục kế hoạch sửa chữa lớn năm.....;

Căn cứ hồ sơ quyết toán công trình: số ngày ... tháng .. năm...;

Căn cứ báo cáo thẩm tra quyết toán sốngày/.../... của Tổ thẩm tra duyệt quyết toán công trình sửa chữa lớn Công ty Điện lực

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt quyết toán công trình: ... với tổng giá trị: ... đồng (Bằng chữ)

Trong đó:

Chi phí thiết bị:..... đồng

Chi phí xây dựng:..... đồng

KTCB khác:..... đồng

Điều 2: Nguồn vốn thực hiện công trình: Sửa chữa lớn của Công ty Điện lực (Trung Tâm).....

Điều 3: Các Ông (bà) Trưởng Phòng KT, KHVT, QLĐT, VP,... Công ty Điện lực
đơn vị thi công và các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- P.TCKT, KT, KH TCT,...;
- Lưu VP, P.TCKT; NVA.()

NGƯỜI ĐÚNG ĐẦU/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(ký tên đóng dấu)

Phụ lục 11

TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC TP HỒ CHÍ MINH
CÔNG TY.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /BB-....., ngày tháng năm 2025

BIÊN BẢN KHẢO SÁT THỰC TRẠNG HƯ HỎNG

Tên đối tượng khảo sát: **Sửa chữa lớn (tên đối tượng thực hiện sửa chữa lớn).....**

Vị trí, địa chỉ khảo sát:

Hội đồng khảo sát:

- Trưởng đoàn:

.....

Chức vụ:

- Thành viên:

1.

Chức vụ:.....

2.

Chức vụ:.....

A. Thuyết minh

I. Mô tả phạm vi

(Nêu rõ phạm vi, khối lượng công việc chính cần thực hiện sửa chữa lớn)

II. Các thông số kỹ thuật chính

II.1. Tình trạng hiện hữu

(Mô tả chung tình trạng vận hành, tình trạng hỏng hóc cần phải sửa chữa, khắc phục và đính kèm hình ảnh)

II.2. Kết quả sau khi sửa chữa

(Nêu rõ kết quả dự kiến đạt được sau khi thực hiện sửa chữa lớn)

B. Khối lượng thực hiện

(Nêu rõ khối lượng công việc, chi tiết vị trí thực hiện sửa chữa lớn)

C. Phương án kỹ thuật sửa chữa lớn

I. Các giải pháp kỹ thuật chính trong sửa chữa lớn

II. Các giải pháp kỹ thuật thi công

II.1. Công tác chuẩn bị thi công

II.2. Tổ chức thi công

III. Bảng tổng hợp giá trị khái toán chi phí sử chữa

D. Kiến nghị, đề xuất

Các thành viên:

Ký tên:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

.....
